



โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้และอยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2563 มีทั้งสิ้น 131 โครงการ 2 แผนงาน ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนา จำนวน 131 โครงการ 2) แผนงานเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (20 โครงการย่อย) และ 3) แผนงานเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (4 โครงการย่อย) มีกรอบเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1,925,152.41 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 มีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนแล้ว 909,927.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.21 ของกรอบเงินตามมติ ครม.

ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน โครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 มีวงเงิน 172,239.72 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) ร้อยละ 81 เงินรายได้ ร้อยละ 16 และเงินงบประมาณ ร้อยละ 3 ตามแผนภาพที่ 1

โดยเป็นประมาณการเบิกจ่ายในสาขาคมนาคมเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา คือ สาขาไฟฟ้า และสาขาประปา คิดเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 4 ตามลำดับ ตามแผนภาพที่ 2

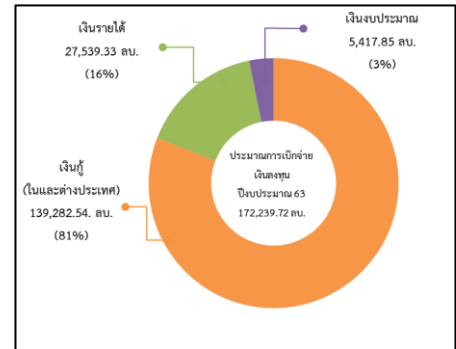


แผนภาพที่ 1: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน

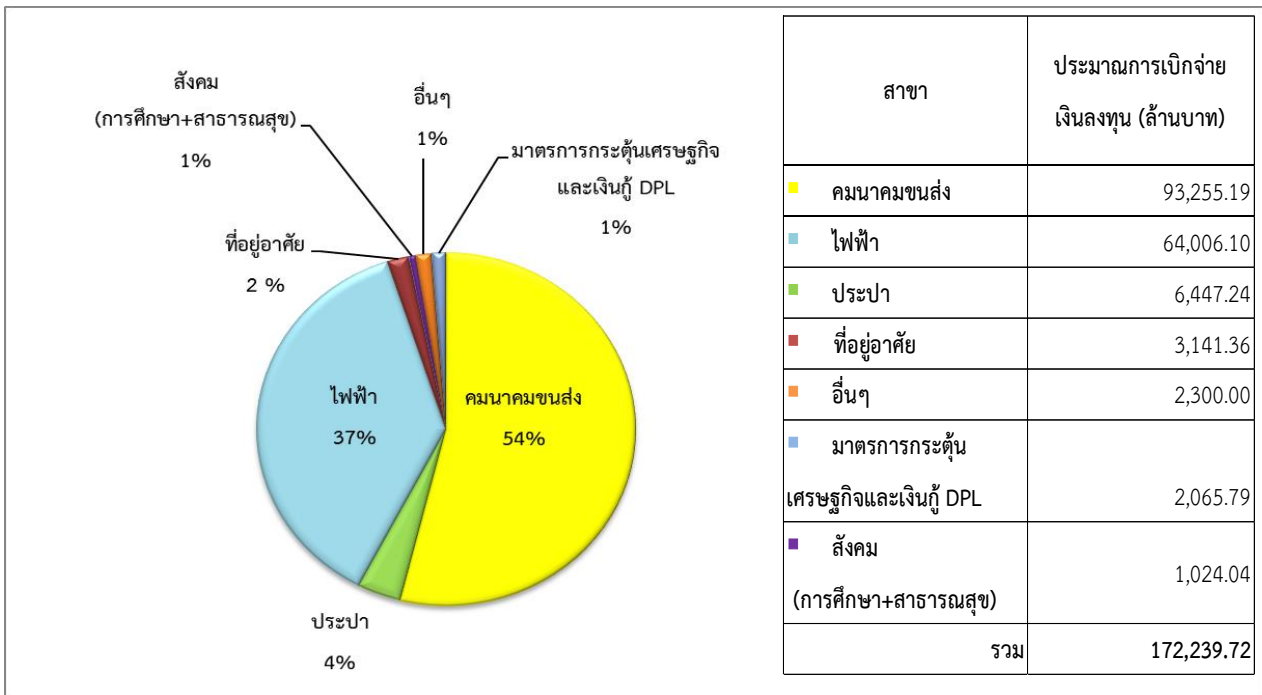

แผนภาพที่ 2 : ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามสาขาลงทุน


เมื่อพิจารณาประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนปีงบประมาณ 2563 แยกรายหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พบว่าหน่วยงานที่มีประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 65,535.92 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 22,185.38 ล้านบาท และการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) 21,866.63 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 3

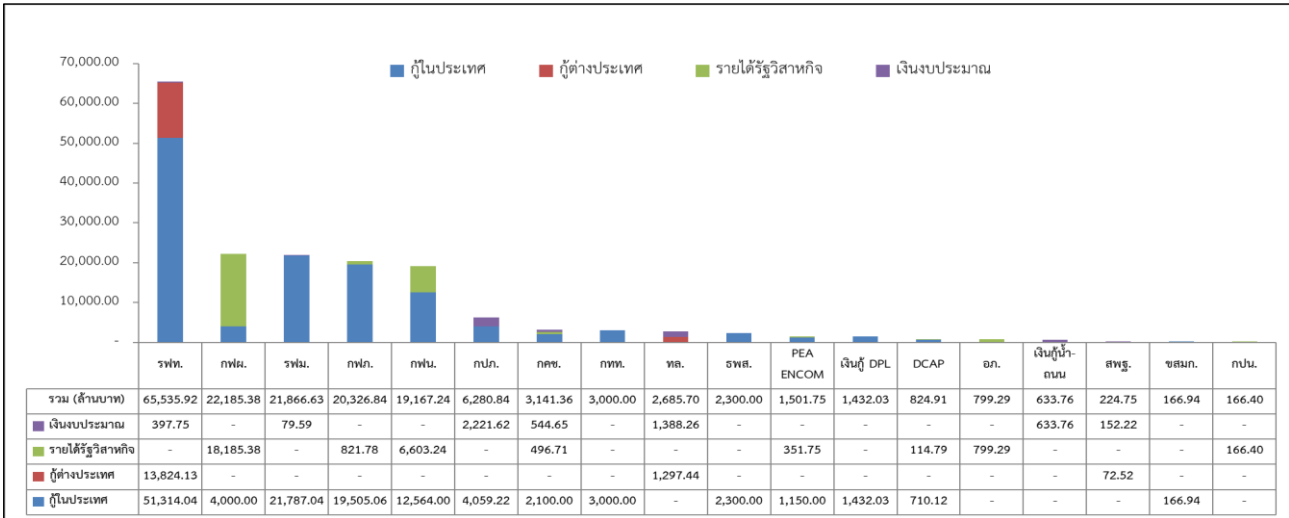

แผนภาพที่ 3: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามหน่วยงาน

ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน


ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 (รอบ 11 เดือน) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมของปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 111,892.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.96 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสมทั้งปี (172,239.72 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 72.92 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม 11 เดือน (ต.ค. 62 – ส.ค. 63) ของปีงบประมาณ 2563 (153,448.25 ล้านบาท)

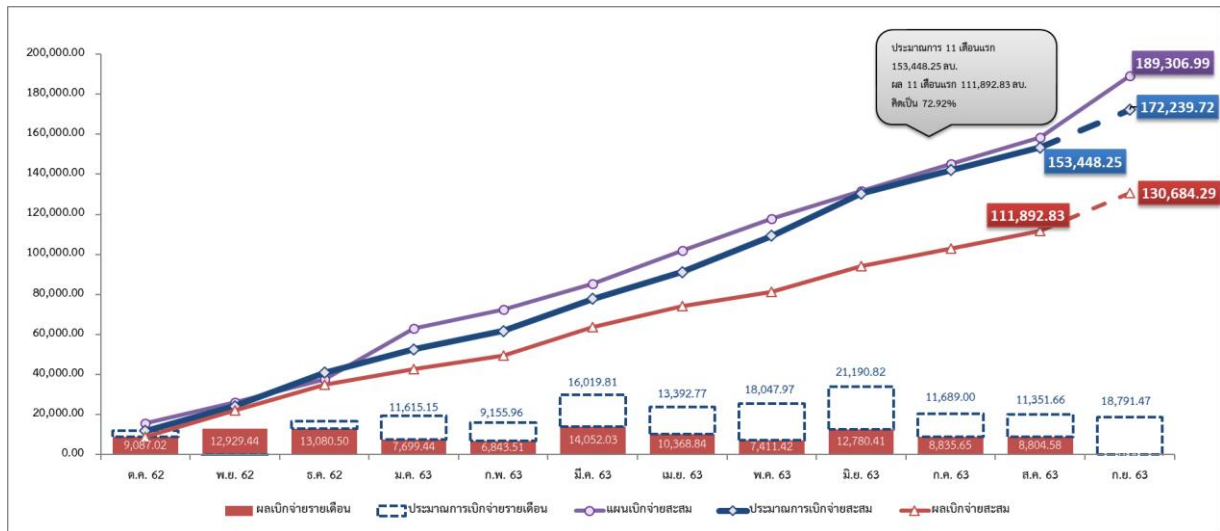

แผนภาพที่ 4: ประมาณการเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกรายเดือน

เมื่อแบ่งผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนตามแผนภาพที่ 4 จะเห็นว่าการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 62) จำนวน 35,096.96 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. – มี.ค. 63) จำนวน 28,594.97 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. – มิ.ย. 63) จำนวน 30,560.67 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. – ส.ค. 63) จำนวน 17,640.23 ล้านบาท ทั้งนี้ หากหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนในเดือนกันยายน 2563 คาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 จะมีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนทั้งสิ้น 130,684.29 ล้านบาท


ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม จำนวน 111,892.83 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) สะสม จำนวน 75,094.48 ล้านบาท (ร้อยละ 67) การเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม จำนวน 35,058.94 ล้านบาท (ร้อยละ 31) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 1,739.41 ล้านบาท (ร้อยละ 2) ตามแผนภาพที่ 5

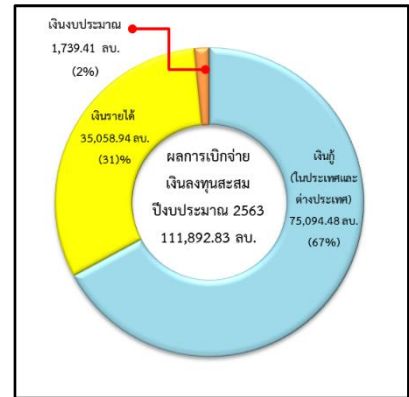

แผนภาพที่ 5: ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน

เปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563

การเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 รายหน่วยงาน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ตามแผนภาพที่ 6

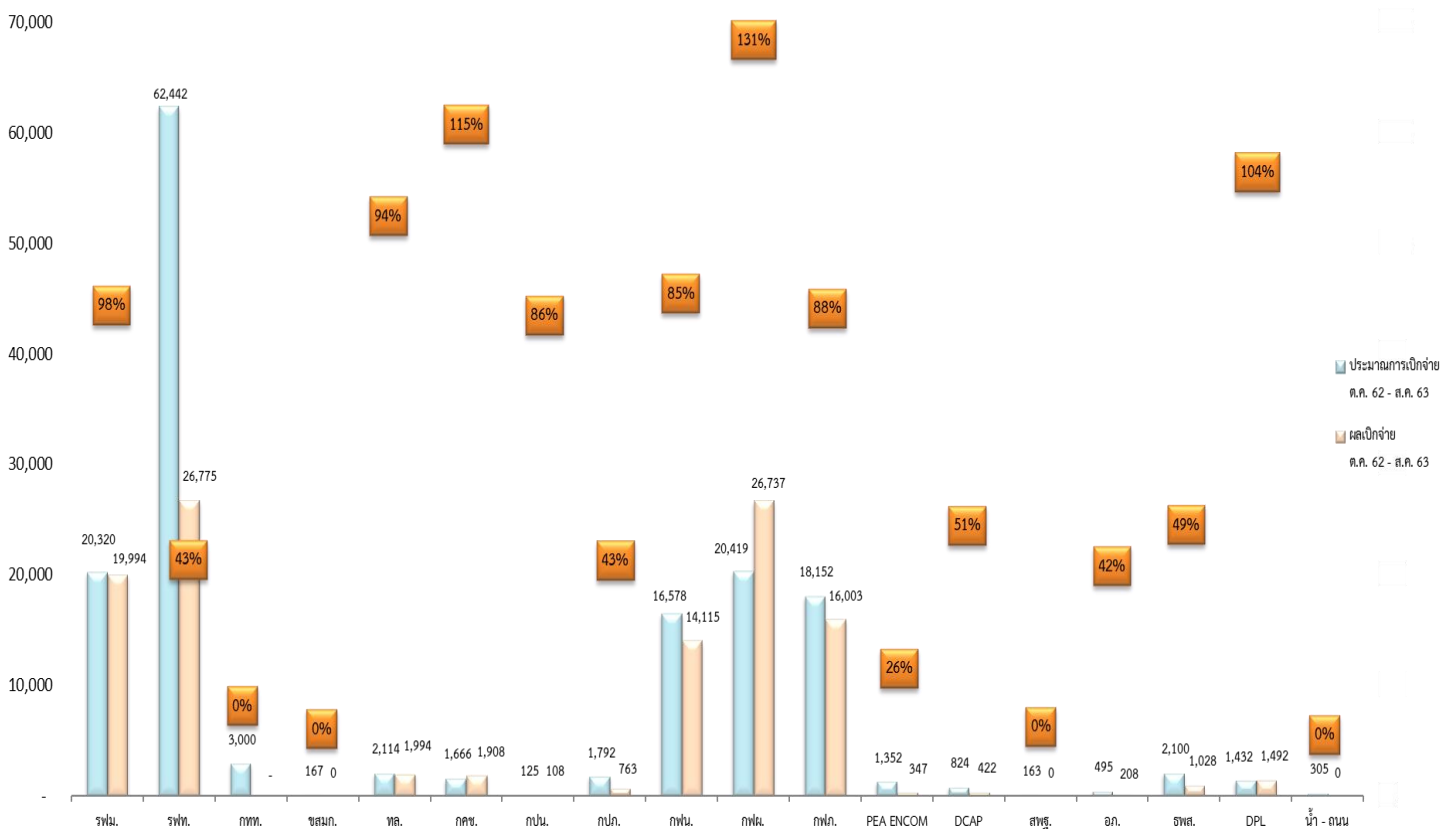

แผนภาพที่ 6: ประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 แยกตามหน่วยงาน

เมื่อเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐสะสม ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานได้ ดังนี้ 1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน 2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนต่ำกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน และ 3) หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม**สูงกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม ประกอบด้วย (1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 131 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากผู้รับจ้างเร่งรัดการดำเนินงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ทำให้สามารถดำเนินโครงการได้เร็วกว่าแผนงาน เช่น โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนงานร้อยละ 2.40 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลระยะที่ 3 ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนงานร้อยละ 3.29 และโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2) (1300 MW) ซึ่งมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2564 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนงานร้อยละ 1.02 เป็นต้น (2) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 115 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม แม้ว่า กคช. จะมีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสม แต่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนจริงเพราะเป็นผลมาจากที่ผ่านมา กคช. มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการต่างๆ ล่าช้าสะสมมาโดยตลอด โดยมีการเร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ ทำให้มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสม

2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม**ต่ำกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมประกอบด้วย (1) รฟท. มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 43 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจาก โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน งานก่อสร้างสัญญางานโยธายังมีความล่าช้าและยังไม่ผ่านการขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เช่นเดิม และโครงการจัดการถักจักรพร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน โดย รฟท. ลงนามในสัญญาซื้อขายแล้วเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 63 และมีแผนที่จะเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ 15 ในเดือน ต.ค. 63 รวมทั้งโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช และโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มัถกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง (Missing Link) ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2563 ตามแผน เนื่องจากทั้ง 4 โครงการ รฟท. อยู่ระหว่างศึกษาการดำเนินโครงการในรูปแบบ PPP เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐ โดย รฟท. ได้ขออนุมัติแผนการกู้เงินของทั้ง 4 โครงการดังกล่าวออกจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 แล้ว (2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 43 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสมเนื่องจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาต่างๆ เช่น สาขาชลบุรี สาขาระยอง และสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นต้น เกิดความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการบางส่วนยังอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง แก้ไขสัญญา แก้ไขแบบและจัดซื้อที่ดิน ออกแบบสำรวจและขออนุญาตใช้ที่ดิน รวมทั้งอยู่ระหว่างประสานงานในส่วนของการขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมธนารักษ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น (3) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 49 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากการก่อสร้างเสาเข็มของโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยายศูนย์ราชการฯ โชนสี ล่าช้ากว่าแผน ทำให้เบิกจ่ายเงินไม่ได้ตามแผน โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสาเข็มแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 63 ทั้งนี้ หน่วยงานได้เริ่มการก่อสร้างชั้นใต้ดิน (Basement) ของโครงการแล้วเมื่อช่วงเดือน ส.ค. 63

3) หน่วยงานที่**ไม่มีผลการเบิกจ่าย**เงินลงทุน ประกอบด้วย (1) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 งานถมทะเล ลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 63 โดย กทท. อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มงาน สำหรับงานก่อสร้างทางบกอยู่ระหว่างกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเนื่องจากโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ต้องเลื่อนการส่งนักเรียนรุ่นที่ 1 ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นจากเดือน เม.ย. 63 เป็น เดือน ต.ค. 63 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 และการก่อสร้างสถาบันไทย – Kosen ทั้ง 2 แห่ง อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 1 แห่ง และอยู่ระหว่างการประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างอีก 1 แห่ง
