


แผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการเงินกู้ที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) จำนวน 113 โครงการ จาก 21 หน่วยงาน วงเงินลงทุนรวม 2,483,144 ลบ. โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 1,208,079 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 49 ของกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

กรอบวงเงินลงทุนตาม มติ ครม. รวม 2,483,144 ล้านบาท



เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 1,208,079 ล้านบาท

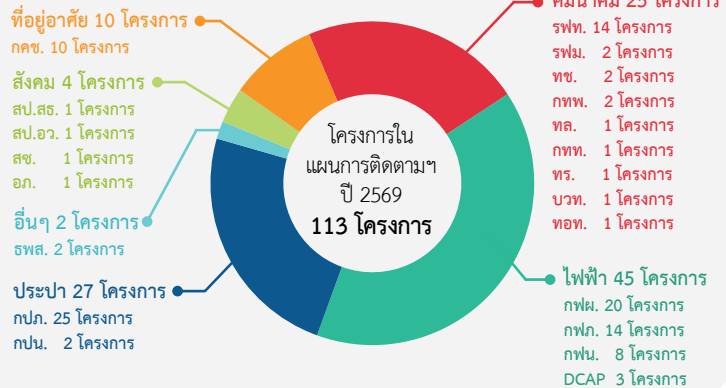

ความเคลื่อนไหวโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2569

โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กฟภ.) จากกรณีมีผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองว่า กฟภ. ยกเลิกการประกวดราคาอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 69 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้อง คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำ 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย กฟภ. คาดว่าจะขออนุมัติสั่งจ้างต่อคณะกรรมการ กฟภ. ได้ภายในเดือน พ.ค. 69




โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช - ตลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (รฟท.) คณะกรรมการ รฟท. อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้าง 2 โครงการดังกล่าว วงเงินรวม 20,777 ลบ. โดย รฟท. อยู่ระหว่างตรวจสอบร่างเอกสารสัญญาจ้างให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง และคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาจ้างในวันที่ 18 พ.ค. 69 และเริ่มเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment) ภายในเดือน ก.ค. 69




แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569

- แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 184,457 ล้านบาท
- แผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - มี.ค. 69 111,361 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - มี.ค. 69 56,340 ล้านบาท




แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกรายเดือน

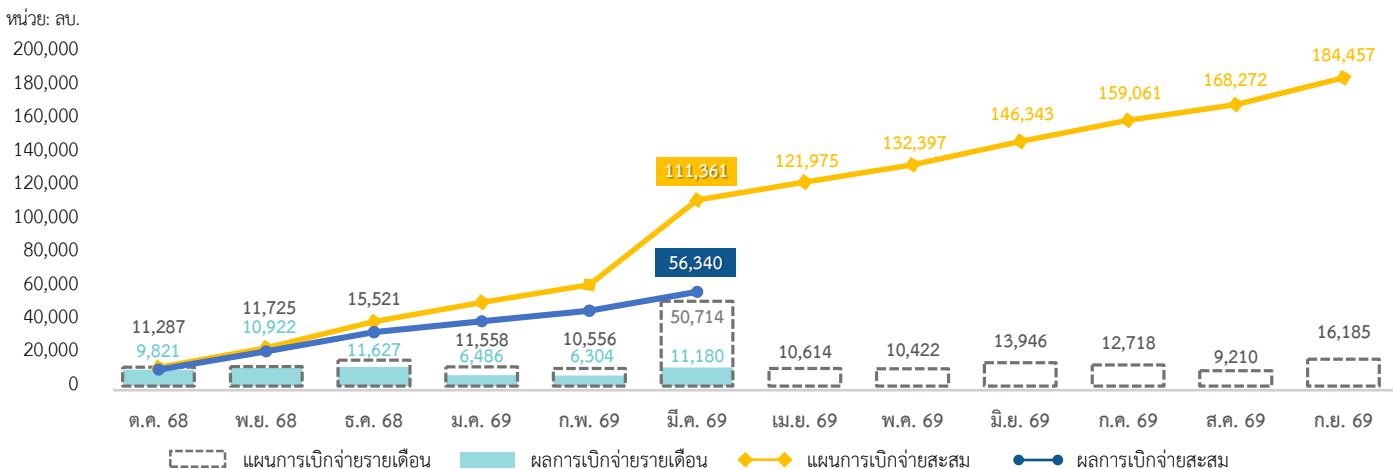

Legend: [] แผนการเบิกจ่ายรายเดือน, [] ผลการเบิกจ่ายรายเดือน, [] แผนการเบิกจ่ายสะสม, [] ผลการเบิกจ่ายสะสม

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามแหล่งเงิน


LOAN เงินกู้ มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - มี.ค. 69 สูงสุด 98,205 ลบ. เบิกจ่ายได้ 31% ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - มี.ค. 69

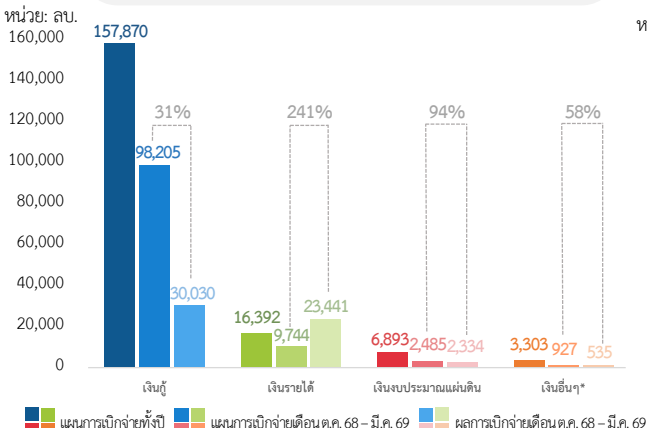

หมายเหตุ: *เงินอื่นๆ หมายถึง เงินกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF)


แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามสาขาการลงทุน

คมนาคม มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - มี.ค. 69 สูงสุด 90,167 ลบ. เบิกจ่ายได้ 38% ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - มี.ค. 69

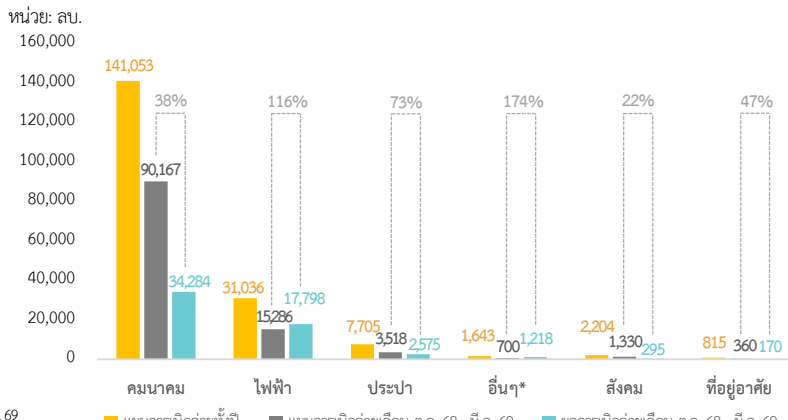

หมายเหตุ: *สาขาอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของโครงการ

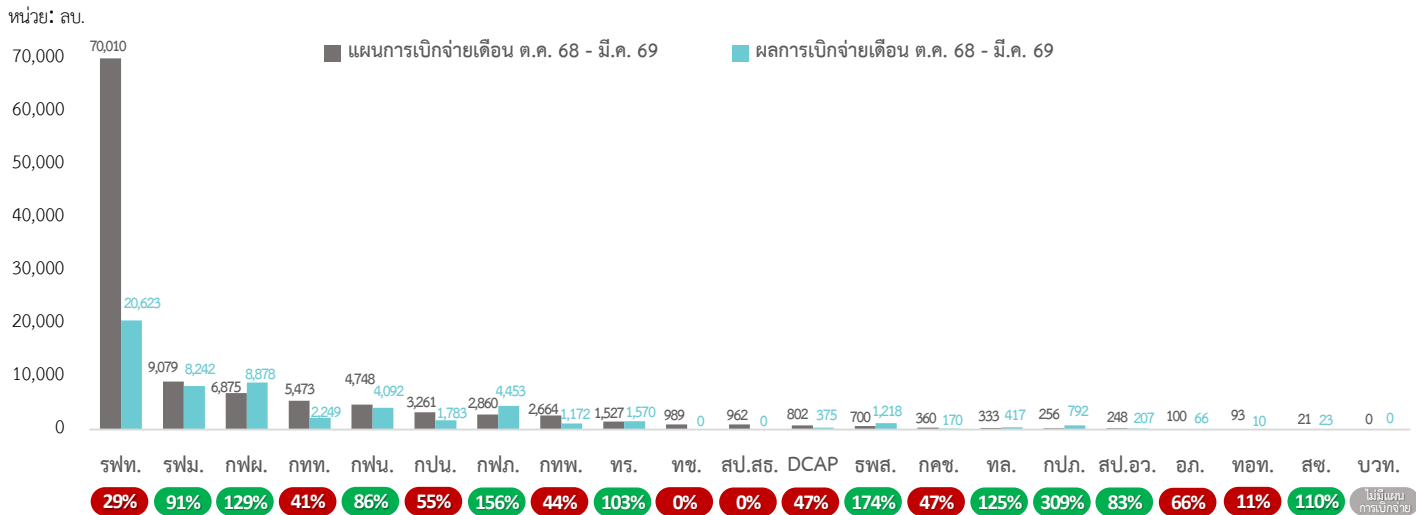

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน สูงกว่า แผนการเบิกจ่ายเงิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)



ผลการเบิกจ่าย 792 ลบ.
309%
สูงกว่าแผน 536 ลบ.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา - ภูเก็ต อำเภอเมือง - ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผู้รับจ้างเร่งรัดงานวางท่อ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ 1) งานวางท่อจากสถานีจ่ายน้ำไม้ขาวถึงพื้นที่เมืองภูเก็ต และ 2) งานวางท่อจากสถานีผลิตน้ำขุมเหมืองถึงสถานีจ่ายน้ำไม้ขาว

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)



ผลการเบิกจ่าย 1,218 ลบ.
174%
สูงกว่าแผน 518 ลบ.

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ธพส. เร่งรัดงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัวพร้อมประกอบและติดตั้งและงานก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ โดย ธพส. ส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานแล้วเสร็จทั้ง 17 หน่วยงานแล้ว ทั้งนี้ โครงการยังเหลืองานตกแต่งภายในอาคารของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ย้ายเข้าพื้นที่และงานปรับปรุงพื้นที่อาคาร B ซึ่ง ธพส. คาดว่างานทั้งหมดจะแล้วเสร็จและปิดโครงการได้ภายในเดือน ก.ย. 69

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **สูงกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ผลการเบิกจ่าย 4,453 ลบ.

156%

สูงกว่าแผน 1,593 ลบ.

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (คพพ.2)

กฟภ. เร่งรัดการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนราธิวาส รวมถึงเร่งรัดงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัดนราธิวาส

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)



ผลการเบิกจ่าย 8,878 ลบ.

129%

สูงกว่าแผน 2,003 ลบ.

โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

กฟผ. เร่งรัดงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าบูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด - พนมสารคาม เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจาก บริษัทบูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

กรมทางหลวง (ทล.)



ผลการเบิกจ่าย 417 ลบ.

125%

สูงกว่าแผน 83 ลบ.

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อกับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

ผู้รับจ้างได้เริ่มงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยอยู่ระหว่างทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง อาทิ คอนกรีต เหล็กเสริม และเจาะเสาเข็มเพื่อทำฐานรากคอนกรีต รวมทั้งหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานสะพาน (Segments) นอกจากนี้ ทล. ได้รื้อย้ายสิ่งกีดขวาง ทางป่า และปรับพื้นที่ระดับดินเพื่อเตรียมเริ่มงานก่อสร้างได้เพิ่มเติม โดยมีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 3.58

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)



ผลการเบิกจ่าย 23 ลบ.

110%

สูงกว่าแผน 2 ลบ.

โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

สซ. เบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประสานงานโครงการฯ (สัญญา 1 ปี) งวดที่ 1/3 และค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้งค่าจัดนิทรรศการในงาน One Stop Open House 2026

กองทัพเรือ (ทร.)



ผลการเบิกจ่าย 1,570 ลบ.

103%

สูงกว่าแผน 43 ลบ.

โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2)

ทร. เร่งรัดการรื้อย้ายสิ่งก่อสร้างเดิม ซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ภายนอกเขตการบิน คาดว่า จะรื้อย้ายแล้วเสร็จเดือน พ.ศ. 69 และ 2) พื้นที่ภายในเขตการบิน คาดว่าจะรื้อย้ายแล้วเสร็จเดือน พ.ย. 69

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)



ผลการเบิกจ่าย 0 ลบ.

0%

ต่ำกว่าแผน 989 ลบ.

โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ทช. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดยเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 68 คณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย สบन. สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมประมง ได้เจรจาสัญญาเงินกู้กับผู้แทนธนาคารโลก (World Bank : WB) แล้ว และ สบน. อยู่ระหว่างเสนอร่างสัญญาเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขเงินกู้และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาเงินกู้ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากนั้น ทช. จึงจะเริ่มเบิกจ่ายเงินตามวงจางานเมื่อสัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)



ผลการเบิกจ่าย 0 ลบ.

0%

ต่ำกว่าแผน 962 ลบ.

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

สป.สธ. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดยเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 คณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย สนบ. สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สป.สธ. ได้เจรจาสัญญาเงินกู้กับผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และ สนบ. อยู่ระหว่างเสนอร่างสัญญาเงินกู้ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบ ก่อนจะเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขเงินกู้และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างสัญญาเงินกู้ต่อไป ทั้งนี้ สป.สธ. ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วและอยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PISC) สำหรับ 5 โรงพยาบาล ซึ่งจะใช้เงินงบประมาณในการดำเนินการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)



ผลการเบิกจ่าย 10 ลบ.

11%

ต่ำกว่าแผน 82 ลบ.

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ทอท. มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ ครม. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก และงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋า (BHS) (ขาเข้าและเปลี่ยนเที่ยวบิน) ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันก่อน ทอท. เริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)



ผลการเบิกจ่าย 20,623 ลบ.

29%

ต่ำกว่าแผน 49,386 ลบ.

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) รฟท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างทดสอบคุณสมบัติเหล็กมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามที่สถาบันเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) เสนอให้ใช้เหล็ก มอก. ของไทย เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุในประเทศ โดย สทร. คาดว่าจะทดสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 69 อย่างไรก็ตาม รฟท. จะใช้ระยะเวลา 3 เดือน สำหรับปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TORs) ภายหลังจากทดสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จ และใช้ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือน ซึ่งอาจทำให้ รฟท. ไม่สามารถลงนามสัญญาจ้างและเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment) ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)



ผลการเบิกจ่าย 2,249 ลบ.

41%

ต่ำกว่าแผน 3,224 ลบ.

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

กทท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล : กทท. อยู่ระหว่างหารือกับผู้รับจ้างเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้างเชื่อมกันคลื่นมีความลึกไม่เพียงพอต่อการนำเรือขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ก่อสร้าง และ 2) งานส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค : กทท. อยู่ระหว่างหารือกับผู้รับจ้างเพื่อปรับแบบงานก่อสร้างสะพานยกระดับเนื่องจากฐานรากสะพานยกระดับทับซ้อนกับแนวรางรถไฟ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)



ผลการเบิกจ่าย 1,172 ลบ.

44%

ต่ำกว่าแผน 1,419 ลบ.

โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง

กทพ. มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน เนื่องจาก กทพ. อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อรอส่งมอบพื้นที่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 นอกจากนี้ กทพ. ได้จัดทำ TORs ของงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการ กทพ. เห็นชอบการดำเนินโครงการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว โดย กทพ. ได้เสนอกระทรวงคมนาคม (คค.) เพื่อพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวด้วยแล้ว ซึ่ง กทพ. คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก คค. และเริ่มประกาศประกวดราคาได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากเดิมไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)



ผลการเบิกจ่าย 375 ลบ.

47%

ต่ำกว่าแผน 427 ลบ.

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โดยเปลี่ยน HRSG และ Steam Turbine เครื่องใหม่ ทดแทนเครื่องเดิม (Revamp Project)

DCAP มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดยกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลโครงการ เพื่อเสนอให้ ครม. พิจารณานุมัติโครงการ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.)



ผลการเบิกจ่าย 170 ลบ.

55%

ต่ำกว่าแผน 190 ลบ.

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3

กคช. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากงานก่อสร้างอาคาร C1 เกิดความล่าช้า จากการที่ กคช. ได้ยกเลิก ประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 69 เพื่อทบทวน TORs ให้มีความรัดกุมและเพิ่มความปลอดภัยด้านการก่อสร้าง ให้มากยิ่งขึ้น โดย กคช. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่า จะได้รับผู้รับจ้างและลงนามสัญญาได้ภายในเดือน มิ.ย. 69

การประปานครหลวง (กปน.)



ผลการเบิกจ่าย 1,783 ลบ.

57%

ต่ำกว่าแผน 1,478 ลบ.

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

กปน. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางมด เอกชนเจ้าของพื้นที่ไม่ประสงค์ขายที่ดิน และเสนอราคาขายที่สูงกว่ากรอบวงเงินรายได้ โดย กปน. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการจัดซื้อที่ดินแห่งใหม่ที่ดินเดิม และ 2) งานอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถจัดหาแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างก่อสร้างและเบิกจ่ายตามงวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ค. 69

องค์การคลังสินค้า (อก.)



ผลการเบิกจ่าย 66 ลบ.

66%

ต่ำกว่าแผน 34 ลบ.

โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2

อก. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก อก. อยู่ระหว่างการตรวจรับงานการติดตั้งระบบน้ำ ระบบไฟ และเครื่องจักร ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานให้ อก. ครบทั้งหมดแล้วในเดือน ม.ค. 69 หากการตรวจรับงานเสร็จสิ้น อก. จะทยอยเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้รับจ้างต่อไป
