


แผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการเงินกู้ที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) จำนวน 113 โครงการ จาก 21 หน่วยงาน วงเงินลงทุนรวม 2,483,144 ลบ. โดย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 1,244,468 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

กรอบวงเงินลงทุนตาม มติ ครม. รวม 2,483,144 ล้านบาท




เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 1,244,468 ล้านบาท

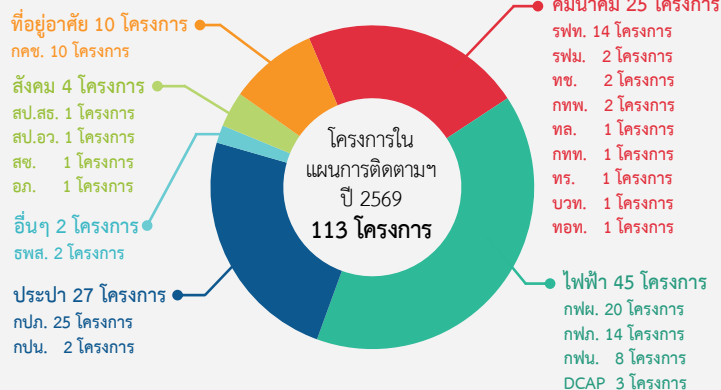

○ ความเคลื่อนไหวโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม 2569

โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา (ทช.) เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 69 กระทรวงการคลังลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารโลก (The World Bank: WB) วงเงิน 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่า วงเงิน 4.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนอนุรักษ์โลมาอิรวดี (พ.ศ. 2567 - 2571) โดยทั้ง 2 โครงการคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ. 2572



โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าช่วนลพบุรี-ปากน้ำโพ (รฟท.) เมื่อวันที่ 30 - 31 ก.ค. 69 กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมที่สถานีปากน้ำโพและศูนย์ควบคุมการเดินรถจากศูนย์กลาง (Central Traffic Control : CTC) แห่งใหม่ ณ สถานีนครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางควบคุมการเดินรถด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขบวนรถให้มีความแม่นยำปลอดภัย ลดระยะเวลาการเดินรถ รวมทั้งเพิ่มความตรงต่อเวลาการเดินรถสายเหนือ โดยจะเปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมเต็มรูปแบบในเดือน ต.ค. 69



แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ พ.ศ. 2569


ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569

แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	184,457	ล้านบาท
แผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - ก.ค. 69	159,061	ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - ก.ค. 69	92,729	ล้านบาท

58%
ของแผนการเบิกจ่าย
เดือน ต.ค. 68 - ก.ค. 69

50%
ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี


แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกรายเดือน

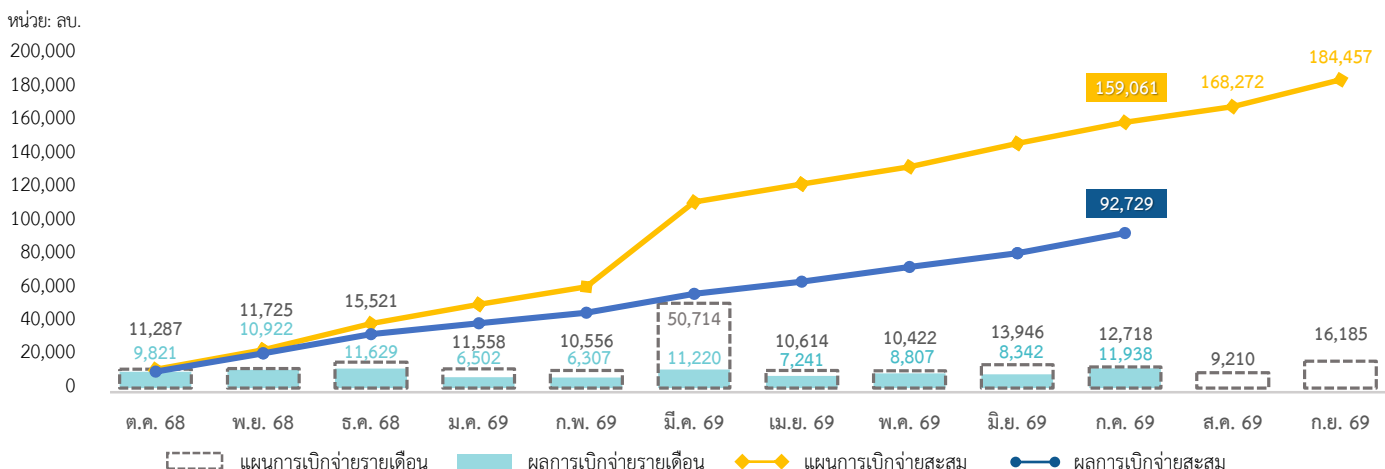

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามแหล่งเงิน

เงินกู้ มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – ก.ค. 69 สูงสุด **136,252** ลบ. เบิกจ่ายได้ **39%** ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – ก.ค. 69

หน่วย: ลบ.

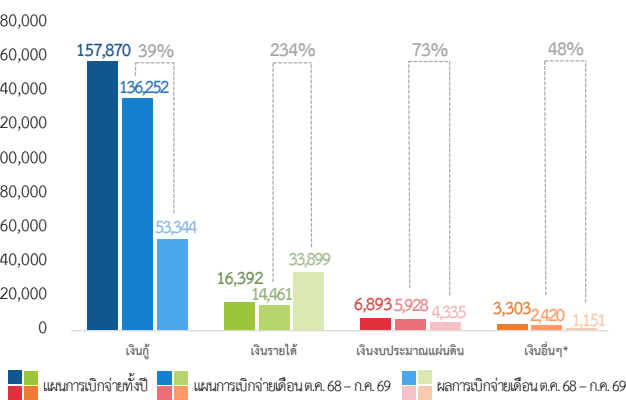


หมายเหตุ: *เงินอื่นๆ หมายถึง เงินกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF)

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามสาขาการลงทุน

คมนาคม มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – ก.ค. 69 สูงสุด **123,868** ลบ. เบิกจ่ายได้ **47%** ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – ก.ค. 69


หน่วย: ลบ.

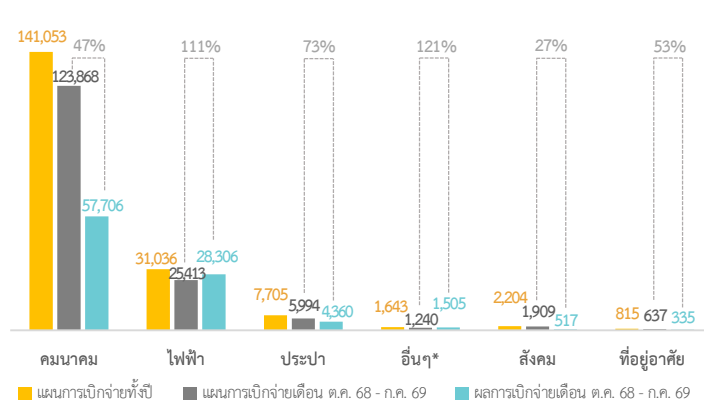

หมายเหตุ: *สาขาอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของโครงการ

หน่วย: ลบ.

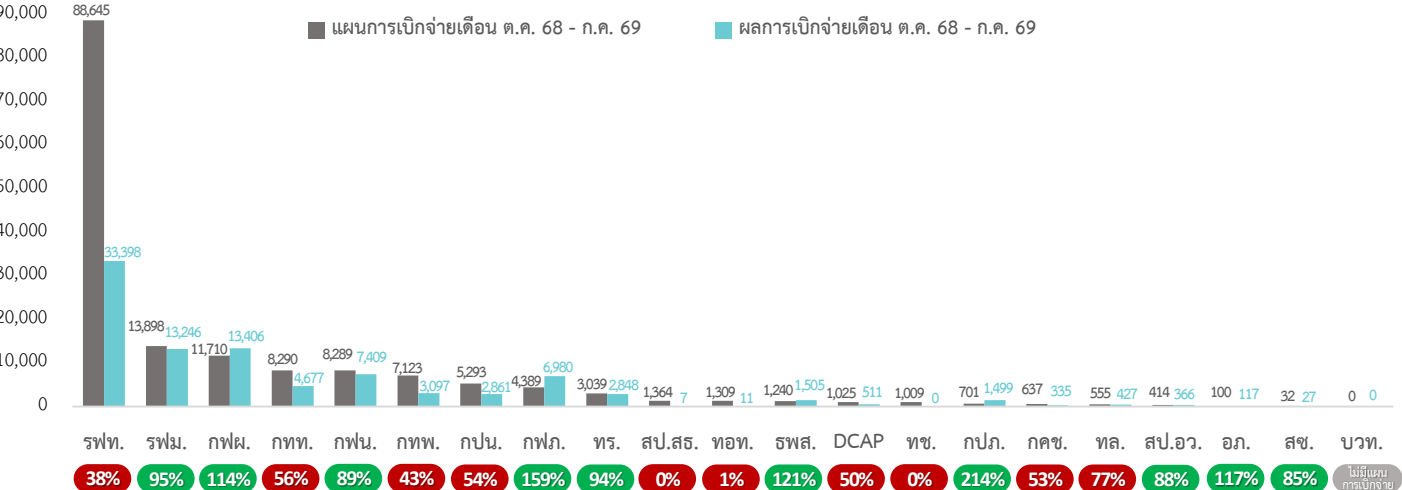

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน สูงกว่า แผนการเบิกจ่ายเงิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)



ผลการเบิกจ่าย 1,499 ลบ.
214%
สูงกว่าแผน 798 ลบ.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาแม่สาย - (ห้วยไคร้) - (แม่จัน) - (เชียงแสน) อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ผู้รับจ้างเร่งรัดงานวางท่อ จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) งานวางท่อจากสถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำโขงไปสถานีผลิตน้ำเชียงแสน 2) งานวางท่อจากสถานีผลิตน้ำเชียงแสน 2 ไปสถานีจ่ายน้ำป่าสัก 3) งานวางท่อจากสถานีจ่ายน้ำป่าสักไปสถานีจ่ายน้ำจันจว้า และ 4) งานวางท่อจากบริเวณแยกเชียงแสนไปสถานีจ่ายน้ำโป่งงาม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ผลการเบิกจ่าย 6,980 ลบ.
159%
สูงกว่าแผน 2,591 ลบ.

โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)
กฟภ. เร่งรัดงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า โดยมีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 80.83

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **สูงกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)



ผลการเบิกจ่าย 1,505 ลบ.

121%

สูงกว่าแผน 265 ลบ.

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ธพส. เร่งรัดงานก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารและงานซื้อขายครุภัณฑ์ลอยตัวพร้อมประกอบและติดตั้งที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3 หน่วยงาน จาก 17 หน่วยงาน โดย 14 หน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เข้าใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โครงการยังเหลืองานปรับปรุงพื้นที่อาคาร B ซึ่ง ธพส. คาดว่างานทั้งหมดจะแล้วเสร็จและปิดโครงการได้ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การเภสัชกรรม (อก.)



ผลการเบิกจ่าย 117 ลบ.

117%

สูงกว่าแผน 17 ลบ.

โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2

อก. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โดย อก. ตรวจสอบระบบสนับสนุนอาคารภายในโรงงาน เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น และงานติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงาน ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมดให้ อก. ในเดือน ม.ค. 69 เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สัญญาจ้างงานได้ครบกำหนดเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 68 และผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอยกเว้นค่าปรับล่าช้า โดย อก. คาดว่าจะสามารถหาข้อสรุปเรื่องการยกเว้นหรือลดค่าปรับก่อสร้างล่าช้าของผู้รับจ้างได้ภายในเดือน ก.ย. 69 และเบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ผู้รับจ้างต่อไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)



ผลการเบิกจ่าย 13,406 ลบ.

114%

สูงกว่าแผน 1,696 ลบ.

โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

กฟผ. เร่งรัดการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของโครงการ เนื่องจากโครงการก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 68 และคาดว่าจะขออนุมัติปิดโครงการภายในเดือน ธ.ค. 69

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)



ผลการเบิกจ่าย 0 ลบ.

0%

ต่ำกว่าแผน 1,009 ลบ.

โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระเส็นสุ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ทช. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดยกระทรวงการคลัง (กค.) ลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารโลก (The World Bank: WB) เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 69 ปัจจุบัน สบ. อยู่ระหว่างเตรียมการรายงานผลการลงนามสัญญาเงินกู้เสนอต่อ ครม. และประกาศผลการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษา และจัดส่งความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ WB ประกอบการพิจารณา เพื่อให้สัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ทช. ได้ประกาศผู้ชนะงานโยธาแล้วเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 69 และจะลงนามสัญญาจ้างและเริ่มเบิกจ่ายเงินตามงวดงานเมื่อสัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)



ผลการเบิกจ่าย 7 ลบ.

0%

ต่ำกว่าแผน 1,357 ลบ.

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

สป.สธ. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดย สบ. เสนอร่างสัญญาเงินกู้ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อเสนอให้ ครม. พิจารณานอมนัดเดือนมิถุนายน 69 และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างสัญญาเงินกู้แล้ว คาดว่า จะลงนามในสัญญาเงินกู้ได้ภายในเดือน ก.ย. 69 ทั้งนี้ สป.สธ. มีการเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment) ของงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PISC) สำหรับ 5 โรงพยาบาลแล้ว ซึ่งใช้เงินงบประมาณในการดำเนินการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)



ผลการเบิกจ่าย 11 ลบ.

1%

ต่ำกว่าแผน 1,297 ลบ.

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ทอท. มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) ได้เสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋า (BHS) (ขาเข้าและเปลี่ยนเที่ยวบิน) ถึง สลค. แล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 69 โดย สลค. อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการนำเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบเรื่องดังกล่าว ก่อน ทอท. เริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)



ผลการเบิกจ่าย 33,398 ลบ.

38%

ต่ำกว่าแผน 55,247 ลบ.

โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่

รฟท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากงานก่อสร้างล่าช้าสะสมจากปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา รวมทั้งปัญหาน้ำมันเครื่องรถไฟตอขาดแคลนเฉพาะจุดในสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงใหม่ - เชียงใหม่ ทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดงานชั่วคราวเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้างและประเมินสภาพพื้นที่เพิ่มเติม รวมทั้ง รฟท. มีนโยบายให้ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยและเสริมความแข็งแรงของระบบค้ำยันการเสริมคอนกรีตถาวรเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคต

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)



ผลการเบิกจ่าย 3,097 ลบ.

43%

ต่ำกว่าแผน 4,026 ลบ.

โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง

กทพ. มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) กทพ. อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อส่งมอบพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 70 จากเดิมภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ 2) กทพ. อยู่ระหว่างเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการ ได้แก่ (1) กรอบวงเงินและแหล่งเงินของโครงการ (2) โครงสร้างค่าผ่านทางในภาพรวมของโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตทั้ง 2 ระยะ และ (3) การแก้ไขแบบก่อสร้างอุโมงค์ให้มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้านธรณีวิทยา ต่อ ครม. โดย กทพ. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยัง คค. แล้วเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 69 และ คค. อยู่ระหว่างเตรียมสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเสนอให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

บริษัท ไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)



ผลการเบิกจ่าย 511 ลบ.

50%

ต่ำกว่าแผน 514 ลบ.

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โดยเปลี่ยน HRSG และ Steam Turbine เครื่องใหม่ ทดแทนเครื่องเดิม (Revamp Project)

DCAP มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดยกระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่องขออนุมัติโครงการฯ ต่อ สศค. แล้วเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 69 และ สศค. อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ตามขั้นตอนต่อไป

การเคหะแห่งชาติ (กคช.)



ผลการเบิกจ่าย 335 ลบ.

53%

ต่ำกว่าแผน 302 ลบ.

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3

กคช. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากงานก่อสร้างอาคาร C1 เกิดความล่าช้า จากการที่ กคช. ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 69 เพื่อทบทวนราคากลางค่าก่อสร้างและประมาณการต้นทุนโครงการใหม่ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย กคช. ได้เปิดซองยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 69 และอยู่ระหว่างพิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.ย. 69

การประปานครหลวง (กปน.)



ผลการเบิกจ่าย 2,861 ลบ.

54%

ต่ำกว่าแผน 2,432 ลบ.

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

กปน. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด เอกชนเจ้าของพื้นที่ไม่ประสงค์ขายที่ดินและเสนอราคาขายที่สูงกว่ากรอบวงเงินรายได้ โดย กปน. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการจัดซื้อที่ดินแห่งใหม่ทดแทนที่ดินเดิม และ 2) งานอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ ผู้รับจ้างประสบปัญหาน้ำและทรายไหลเข้าบ่อในขั้นตอนการขุดเจาะอุโมงค์ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยผู้รับจ้างและ กปน. อยู่ระหว่างหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะก่อสร้างภายหลังหาหรือแนวทางแล้วเสร็จต่อไป

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)



ผลการเบิกจ่าย 4,677 ลบ.

56%

ต่ำกว่าแผน 3,613 ลบ.

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

กทท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล : กทท. อยู่ระหว่างหารือกับผู้รับจ้างเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นมีความลึกไม่เพียงพอต่อการนำเรือขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ก่อสร้าง และ 2) งานส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค : การก่อสร้างสะพานยกระดับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับแนวรางรถไฟและพื้นที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เพื่อตรวจสอบตู้สินค้ามีการปล่อยรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ ผู้รับจ้างได้จ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจการปล่อยรังสีในพื้นที่และส่งผลการตรวจสอบให้ กทท. แล้ว โดย กทท. อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารถึงกรมศุลกากรและสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ เพื่อขอความเห็นชอบผลการตรวจดังกล่าวก่อนเริ่มก่อสร้างสะพานยกระดับต่อไป

กรมทางหลวง (ทล.)



ผลการเบิกจ่าย 427 ลบ.

77%

ต่ำกว่าแผน 128 ลบ.

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

ทล. มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน เนื่องจาก ทล. พบอุปสรรคหน้างานจากการรื้อย้ายสิ่งกีดขวางในพื้นที่ก่อสร้างจากงานสาธารณูปโภคอื่น อาทิ ท่อประปาที่ขวางบริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ซึ่งเป็นแนวก่อสร้างของโครงการที่ ทล. จะต้องปรับปรุงทาง ในกรณีนี้ ทล. อยู่ระหว่างเร่งรัดการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคเพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวางต่อไป โดยมีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 7.55
