



แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามแหล่งเงิน

เงินกู้ มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - มิ.ย. 69 สูงสุด **127,236** ลบ. เบิกจ่ายได้ **37%** ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - มิ.ย. 69

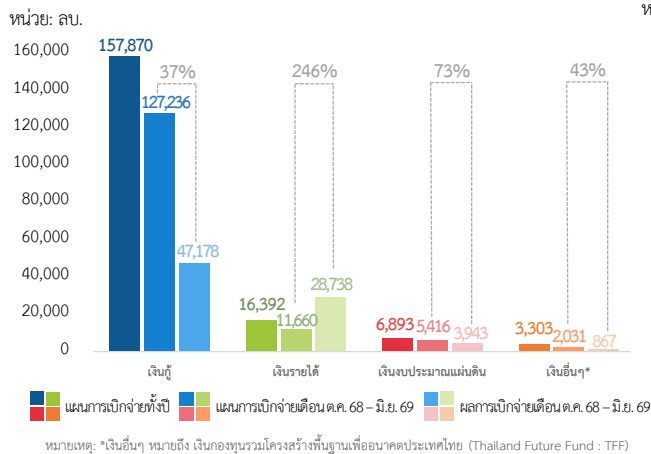


แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามสาขาการลงทุน

คมนาคม มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - มิ.ย. 69 สูงสุด **115,784** ลบ. เบิกจ่ายได้ **43%** ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - มิ.ย. 69

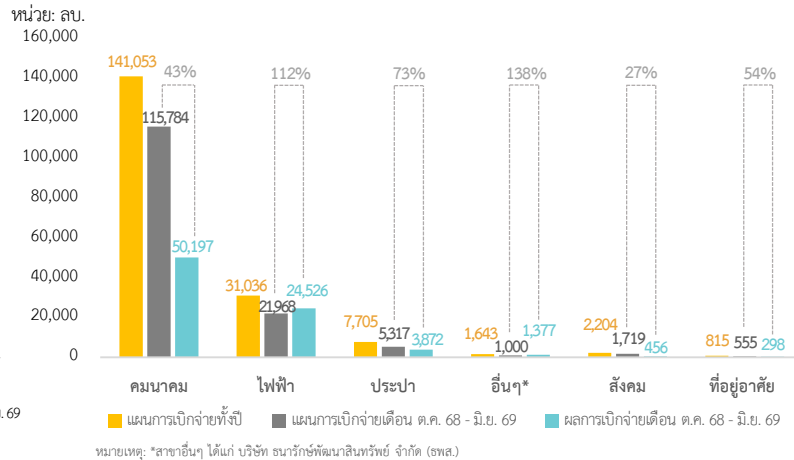

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของโครงการ

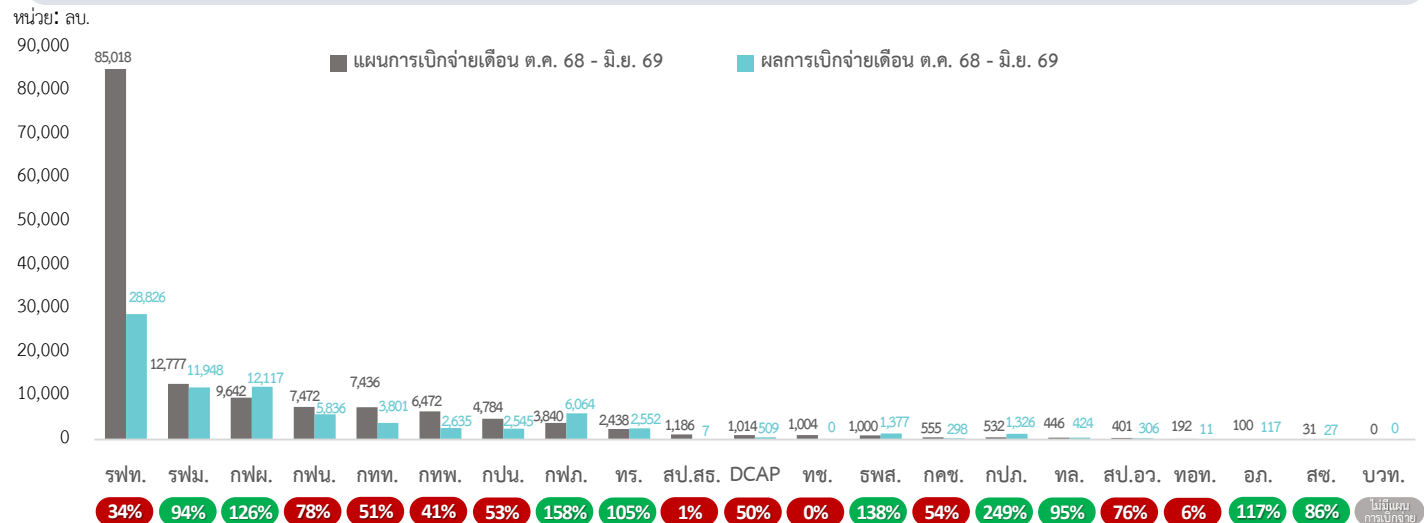

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน สูงกว่า แผนการเบิกจ่ายเงิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ผลการเบิกจ่าย 1,326 ลบ.
249%
สูงกว่าแผน 794 ลบ.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา-ภูเก็ต อำเภอเมือง-ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ผู้รับจ้างเร่งรัดวางท่อ จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) งานวางท่อจากสถานีจ่ายน้ำไข้วถึงพื้นที่เมืองภูเก็ต ในเขตทางหลวงหมายเลข 4027 จำนวน 1 เส้นทาง และในเขตทางหลวงหมายเลข 4302 จำนวน 1 เส้นทาง และ 2) งานวางท่อจากสถานีผลิตน้ำชุมเหืองถึงสถานีจ่ายน้ำไข้ว ในเขตทางหลวงหมายเลข 4303 จำนวน 1 เส้นทาง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผลการเบิกจ่าย 6,064 ลบ.
158%
สูงกว่าแผน 2,224 ลบ.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพ.3) กฟภ. อยู่ระหว่างจัดท้าวสและอุปกรณ์และจัดสรรค่าใช้จ่ายให้กับ กฟภ. พื้นที่ โดย กฟภ. ได้อนุมัติขยายเขตราษฎรรายใหม่ จำนวน 10,448 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 899 ครัวเรือน

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน สูงกว่า แผนการเบิกจ่ายเงิน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)



ผลการเบิกจ่าย 1,377 ลบ.

138%

สูงกว่าแผน 377 ลบ.

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ธพส. เร่งรัดงานจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์พร้อมประกอบและติดตั้งและงานก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ โดย ธพส. ส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานแล้วเสร็จทั้ง 17 หน่วยงานแล้ว ทั้งนี้ โครงการยังเหลืองานตกแต่งภายในอาคารของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ย้ายเข้าพื้นที่ จำนวน 4 หน่วยงาน และงานปรับปรุงพื้นที่อาคาร B ซึ่ง ธพส. คาดว่างานทั้งหมดจะแล้วเสร็จและปิดโครงการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)



ผลการเบิกจ่าย 12,117 ลบ.

126%

สูงกว่าแผน 2,474 ลบ.

โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า งานสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางละมุง และเขื่อนภูมิพล คู่สัญญาของ กฟผ. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เร็วกว่าแผน โดยมีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 95.35

องค์การเภสัชกรรม (อก.)



ผลการเบิกจ่าย 117 ลบ.

117%

สูงกว่าแผน 17 ลบ.

โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2

อก. ตรวจรับงานระบบสนับสนุนอาคารภายในโรงงาน เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น และงานติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงาน ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมดให้ อก. ในเดือน ม.ค. 69 เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สัญญาจ้างงานได้ครบกำหนดเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 68 และผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอข延เวลาปรับล่าช้า โดย อก. คาดว่าจะสามารถหาข้อสรุปเรื่องการยกเว้นหรือลดค่าปรับก่อสร้างล่าช้าของผู้รับจ้างได้ภายในเดือน ก.ย. 69 และเบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ผู้รับจ้างต่อไป

กองทัพเรือ (ทร.)



ผลการเบิกจ่าย 2,552 ลบ.

105%

สูงกว่าแผน 114 ลบ.

โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2)

ทร. อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสิ่งก่อสร้างเดิม ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ก่อสร้าง และก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความพร้อม

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน ต่ำกว่า แผนการเบิกจ่ายเงิน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)



ผลการเบิกจ่าย 0 ลบ.

0%

ต่ำกว่าแผน 1,004 ลบ.

โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ทช. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดยเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 69 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติเงื่อนไขเงินกู้และเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างสัญญาเงินกู้แล้ว คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาเงินกู้ร่วมกันภายในเดือน ก.ค. 69 ทั้งนี้ ทช. ได้ประกาศผู้ชนะงานโยธาแล้วเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 69 และจะลงนามสัญญาจ้างและเริ่มเบิกจ่ายเงินตามงวดงานเมื่อสัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สร.)



ผลการเบิกจ่าย 7 ลบ.

1%

ต่ำกว่าแผน 1,180 ลบ.

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

สป.สร. มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน โดย สบ. อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเสนอร่างสัญญาเงินกู้ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขเงินกู้และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างสัญญาเงินกู้ต่อไป คาดว่าจะลงนามในสัญญาเงินกู้ได้ภายในเดือน ก.ย. 69 ทั้งนี้ สป.สร. มีการเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment) ของงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PISC) สำหรับ 5 โรงพยาบาลแล้ว ซึ่งใช้เงินงบประมาณในการดำเนินการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)



ผลการเบิกจ่าย 11 ลบ.

6%

ต่ำกว่าแผน 181 ลบ.

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ทอท. มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดยกระทรวงคมนาคมรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อเสนอ ครม. ให้เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและงานซ่อมพร้อมติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋า (BHS) (ขาเข้าและเปลี่ยนเที่ยวบิน) ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ก่อน ทอท. เริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)



ผลการเบิกจ่าย 28,826 ลบ.

34%

ต่ำกว่าแผน 56,192 ลบ.

โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช - ดลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี)

รฟท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก รฟท. ลงนามในสัญญาจ้างงานโยธากับผู้รับจ้างล่าช้ากว่าแผนจากเดือน เม.ย. 69 เป็นเดือน พ.ค. 69 ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment) ล่าช้า ซึ่ง รฟท. คาดว่าจะเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment) ภายในเดือน ก.ค. 69

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)



ผลการเบิกจ่าย 2,635 ลบ.

41%

ต่ำกว่าแผน 3,837 ลบ.

โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจุดโซติ-ถนนลำลูกกา)

กทพ. มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน เนื่องจาก กทพ. อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569 สำหรับงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างและเริ่มก่อสร้างในพื้นที่ของ กทพ. ที่ได้รับอนุญาตแล้ว อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือ กทพ. อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขในบันทึกความตกลงร่วมกัน (MOU) กับ ทล. และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งคาดว่าจะลงนาม MOU กับ ทล. และ กทม. ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากเดิมที่กำหนดไว้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บริษัท ไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)



ผลการเบิกจ่าย 1,014 ลบ.

50%

ต่ำกว่าแผน 505 ลบ.

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โดยเปลี่ยน HRSG และ Steam Turbine เครื่องใหม่ ทดแทนเครื่องเดิม (Revamp Project)

DCAP มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดยกระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่องขออนุมัติโครงการฯ ต่อ สลค. แล้วเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 69 และ สลค. อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการฯ เพื่อเตรียมเสนอ ครม. ตามขั้นตอนการขออนุมัติโครงการฯ ต่อไป

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)



ผลการเบิกจ่าย 3,801 ลบ.

51%

ต่ำกว่าแผน 3,635 ลบ.

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

กทท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล : กทท. อยู่ระหว่างหารือกับผู้รับจ้างเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้างเชื่อมกันคลื่นมีความลึกไม่เพียงพอต่อการนำเรือขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ก่อสร้าง และ 2) งานส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค : การก่อสร้างสะพานยกระดับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับแนวรางรถไฟและพื้นที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เพื่อตรวจสอบตู้สินค้ามีการปล่อยรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ ผู้รับจ้างได้จ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจการปล่อยรังสีในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำผลการตรวจสอบเพื่อเสนอ กทท. และจะเสนอสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อรับรองผลการตรวจดังกล่าว

การประปานครหลวง (กปน.)



ผลการเบิกจ่าย 2,545 ลบ.

53%

ต่ำกว่าแผน 2,239 ลบ.

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

กปน. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางมด เอกชนเจ้าของพื้นที่ไม่ประสงค์ขายที่ดิน และเสนอราคาขายที่สูงกว่ากรอบเงินรายได้ โดย กปน. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการจัดซื้อที่ดินแห่งใหม่ทดแทนที่ดินเดิม และ 2) งานอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ ผู้รับจ้างประสบปัญหา น้ำและทรายไหลเข้าบ่อในขั้นตอนการขุดเจาะอุโมงค์ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างหารือร่วมกับ กปน. เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การเคหะแห่งชาติ (กคช.)



ผลการเบิกจ่าย 298 ลบ.

54%

ต่ำกว่าแผน 257 ลบ.

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3

กคช. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากงานก่อสร้างอาคาร C1 เกิดความล่าช้า จากการที่ กคช. ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 69 เพื่อทบทวนราคากลางค่าก่อสร้างและประมาณการต้นทุนโครงการใหม่ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย กคช. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง ซึ่งมีการเปิดซองยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 69 คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.ย. 69

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)



ผลการเบิกจ่าย 306 ลบ.

76%

ต่ำกว่าแผน 96 ลบ.

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

สป.อว. เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างแก้ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax: VAT) สำหรับการจ่ายค่าบริการของสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาตินิปปูน (National Institute of Technology: NIT) ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศให้กับ NIT ได้

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ผลการเบิกจ่าย 5,836 ลบ.

78%

ต่ำกว่าแผน 1,636 ลบ.

แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

กฟน. มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) ความล่าช้าจากการขออนุญาตจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทล. และกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดย กฟน. ได้รับอนุญาตจาก กทม. ให้ก่อสร้างครบทุกพื้นที่แล้วเมื่อเดือน ม.ค. 69 ปัจจุบัน กฟน. อยู่ระหว่างก่อสร้างตามแผนงาน และ 2) กฟน. มีพื้นที่โครงการบางส่วนที่ต้องดำเนินการร่วมกับ รฟม. โดยใช้ผู้รับจ้างรายเดียวกัน เพื่อลดปัญหาการปรับแบบก่อสร้างบริเวณพื้นที่งานทับซ้อนกัน ได้แก่ (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และ (3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ปัจจุบัน กฟน. ลงนามสัญญาแล้วบางส่วนและคาดว่าจะลงนามสัญญาส่วนที่เหลือทั้งหมดได้ภายในปี 2569
