



### แผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการเงินกู้ที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) จำนวน 113 โครงการ จาก 21 หน่วยงาน วงเงินลงทุนรวม 2,483,144 ลบ. โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 1,224,159 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 49 ของกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

กรอบวงเงินลงทุนตาม มติ ครม. รวม 2,483,144 ล้านบาท




เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2569 1,224,159 ล้านบาท

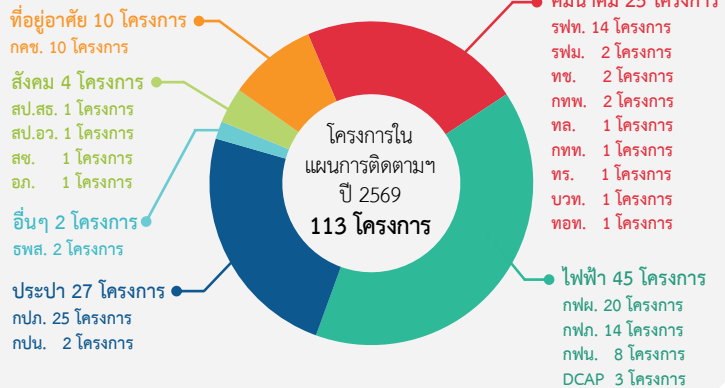

### ความเคลื่อนไหวโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช - ดลิ่งชัน - ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย - กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) และ โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (รฟท.) เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 69 รฟท. ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ โดยคาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ในเดือน ก.ค. 69 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2572




โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C (รพส.) เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 69 รพส. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม MOU การขับเคลื่อนการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นต้นแบบของคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Government Complex) โดยจะร่วมกันจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภาครัฐอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในอนาคต




### แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ พ.ศ. 2569

### ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2569

- แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 184,457 ล้านบาท
- แผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - พ.ค. 69 132,397 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - พ.ค. 69 72,420 ล้านบาท




### แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกรายเดือน

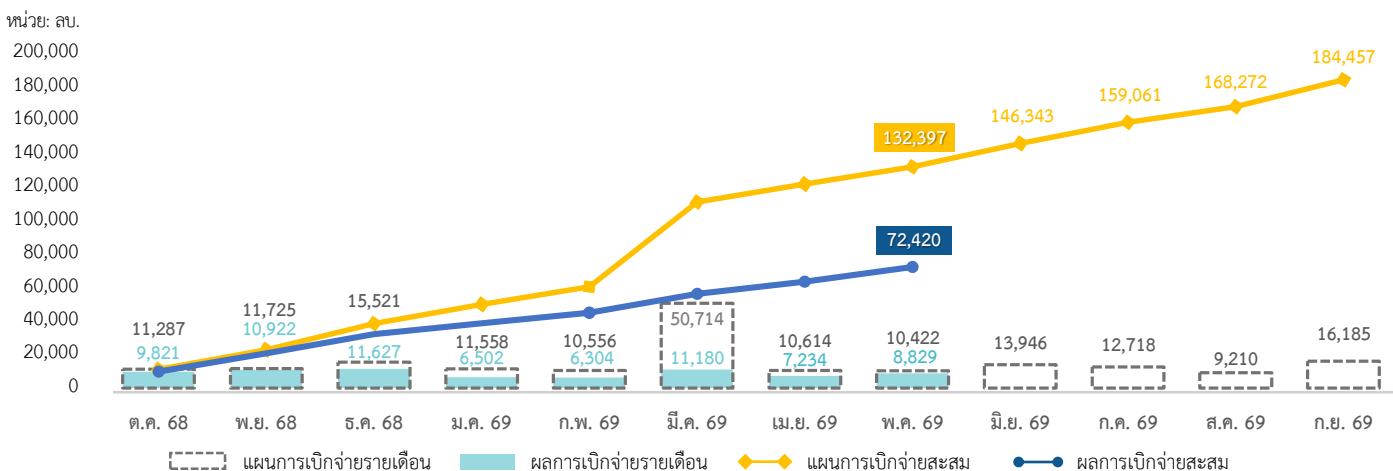

Legend: [ ] แผนการเบิกจ่ายรายเดือน, [ ] ผลการเบิกจ่ายรายเดือน, [ ] แผนการเบิกจ่ายสะสม, [ ] ผลการเบิกจ่ายสะสม


### แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามแหล่งเงิน

**LOAN** เงินกู้ มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - พ.ค. 69 สูงสุด 115,936 ลบ. เบิกจ่ายได้ 34% ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - พ.ค. 69

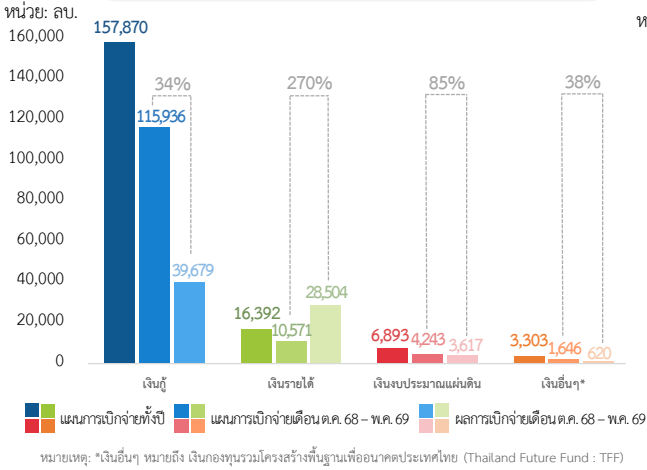


### แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามสาขาการลงทุน

**คมนาคม** มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - พ.ค. 69 สูงสุด 106,089 ลบ. เบิกจ่ายได้ 42% ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - พ.ค. 69

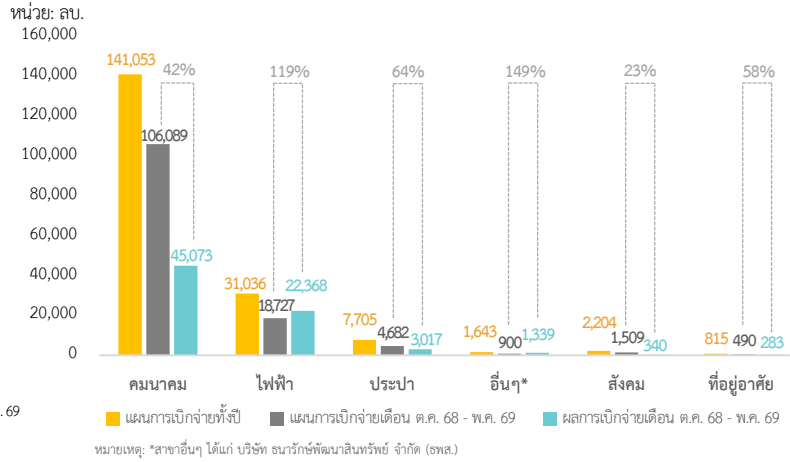

### แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของโครงการ

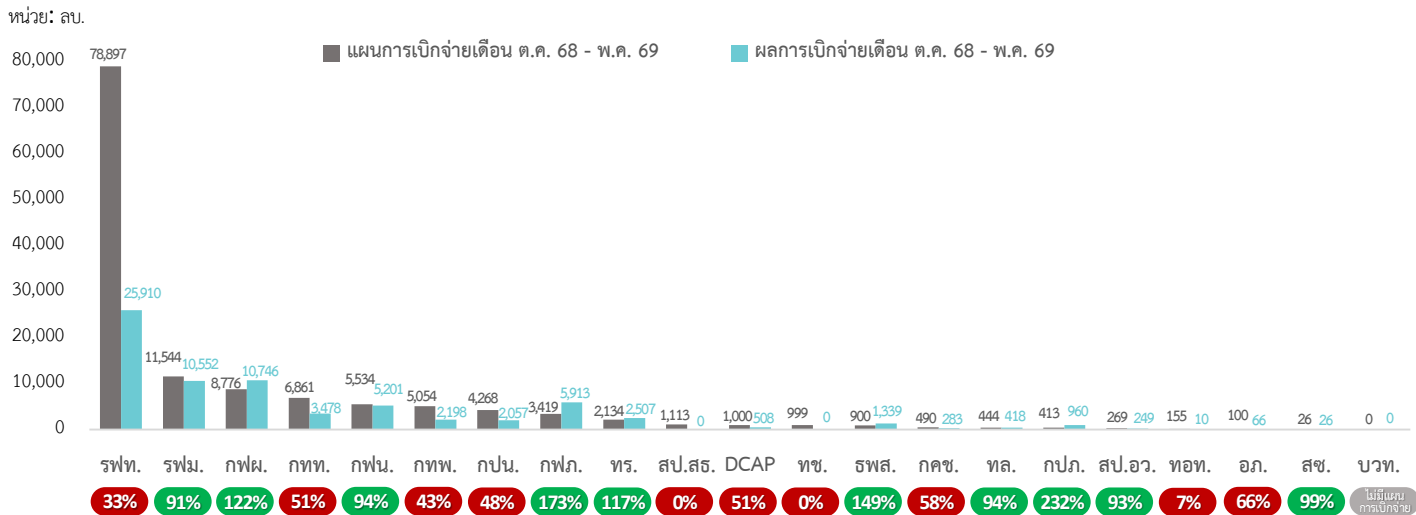

### หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน สูงกว่า แผนการเบิกจ่ายเงิน

#### การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ผลการเบิกจ่าย 960 ลบ.  
**232%**  
สูงกว่าแผน 547 ลบ.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาแม่สาย - (ห้วยไคร้) - (แม่จัน) - (เชียงแสน) อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
ผู้รับจ้างเร่งรัดงานวางท่อ จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) งานวางท่อจากสถานีสูบน้ำดิบแม่โขงไปสถานีผลิตน้ำเชียงแสน 2) งานวางท่อจากสถานีผลิตน้ำเชียงแสน 2 ไปสถานีจ่ายน้ำป่าสัก 3) งานวางท่อจากสถานีจ่ายน้ำป่าสักไปสถานีจ่ายน้ำจันจว้า และ 4) งานวางท่อจากบริเวณแยกเชียงแสนไปสถานีจ่ายน้ำไปงาม

#### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ผลการเบิกจ่าย 5,913 ลบ.  
**173%**  
สูงกว่าแผน 2,494 ลบ.

โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2)  
กฟภ. เร่งรัดงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและงานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า รวมถึงเร่งรัดงานระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 กิโลโวลต์ และระบบจำหน่ายแรงต่ำ

### หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **สูงกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

#### บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)



ผลการเบิกจ่าย 1,339 ลบ.

149%

สูงกว่าแผน 439 ลบ.

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ธพส. เร่งรัดงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัวพร้อมประกอบและติดตั้งและงานก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ โดย ธพส. ส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานแล้วเสร็จทั้ง 17 หน่วยงานแล้ว ทั้งนี้ โครงการยังเหลืองานตกแต่งภายในอาคารของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ย้ายเข้าพื้นที่ จำนวน 4 หน่วยงาน และงานปรับปรุงพื้นที่อาคาร B ซึ่ง ธพส. คาดว่างานทั้งหมดจะแล้วเสร็จและปิดโครงการได้ภายในเดือน ก.ย. 69

#### การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)



ผลการเบิกจ่าย 10,746 ลบ.

122%

สูงกว่าแผน 1,970 ลบ.

โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า โครงการฯ มีการเบิกจ่ายค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดินของสายส่ง 500 kV ไทรน้อย - แจ่งวัฒนะ มากกว่าแผน เนื่องจากกรมธนารักษ์กำหนดราคาประเมินในอัตราที่สูงขึ้น โดยมีผลการดำเนินงานสะสม ร้อยละ 40.96

#### กองทัพเรือ (ทร.)



ผลการเบิกจ่าย 2,507 ลบ.

117%

สูงกว่าแผน 373 ลบ.

โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2) ทร. เร่งรัดการรื้อย้ายสิ่งก่อสร้างเดิมและปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ก่อสร้าง และจะเริ่มงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความพร้อมต่อไป

### หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

#### สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)



ผลการเบิกจ่าย 0 ลบ.

0%

ต่ำกว่าแผน 1,113 ลบ.

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

สป.สธ. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดย สนบ. อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะเสนอร่างสัญญาเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขเงินกู้และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างสัญญาเงินกู้ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 69 สป.สธ. ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PISC) สำหรับ 5 โรงพยาบาลแล้ว ซึ่งจะใช้งบประมาณในการดำเนินการ โดยที่ปรึกษา PISC ได้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พ.ค. 69 และคาดว่าจะเบิกจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า (Advance Payment) ในเดือน มิ.ย. 69

#### กรมทางหลวงชนบท (ทช.)



ผลการเบิกจ่าย 0 ลบ.

0%

ต่ำกว่าแผน 999 ลบ.

โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ทช. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดย สนบ. ได้เสนอร่างสัญญาเงินกู้ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติเงื่อนไขเงินกู้และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างสัญญาเงินกู้แล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญาเงินกู้ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากนั้น ทช. จึงจะเริ่มเบิกจ่ายเงินตามวงงานเมื่อสัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ

#### บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)



ผลการเบิกจ่าย 10 ลบ.

7%

ต่ำกว่าแผน 145 ลบ.

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ทอท. มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดยกระทรวงคมนาคมรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึง สลค. เพื่อเสนอ ครม. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋า (BHS) (ขาเข้าและเปลี่ยนเที่ยวบิน) ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ก่อน ทอท. เริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

#### การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)



ผลการเบิกจ่าย 25,910 ลบ.

33%

ต่ำกว่าแผน 52,987 ลบ.

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) รฟท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานก่อสร้างโยธา รฟท. อยู่ระหว่างตรวจรับและจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และ 2) งาน Detailed Design ของสัญญา 2.3 งานระบบรถไฟและเครื่องกล กวดที่ 2 ผู้รับจ้างฝ่ายจีนยังส่งมอบงานไม่ครบถ้วน ซึ่ง รฟท. คาดว่าจะเบิกจ่ายค่างาน Detailed Design ดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 70

### หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

#### การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)



ผลการเบิกจ่าย 2,198 ลบ.

**43%**

ต่ำกว่าแผน 2,856 ลบ.

##### โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้ - ป่าตอง

กทพ. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก กทพ. อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองมอบพื้นที่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 นอกจากนี้ กทพ. ได้จัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of References : TORs) ของงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการ กทพ. เห็นชอบการดำเนินโครงการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว โดย กทพ. ได้เสนอกระทรวงคมนาคม (คค.) เพื่อพิจารณาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวด้วยแล้ว ซึ่ง กทพ. คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก คค. และเริ่มประกาศประกวดราคาได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากเดิมไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

#### การประปานครหลวง (กปน.)



ผลการเบิกจ่าย 2,057 ลบ.

**48%**

ต่ำกว่าแผน 2,212 ลบ.

##### โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

กปน. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางต๊อย เอกชนเจ้าของพื้นที่ไม่ประสงค์ขายที่ดิน และเสนอราคาขายที่สูงกว่ากรอบวงเงินรายได้ โดย กปน. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการจัดซื้อที่ดินแห่งใหม่ทดแทนที่ดินเดิม และ 2) งานอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ ผู้รับจ้างประสบปัญหา น้ำและทรายไหลเข้าบ่อในขั้นตอนการขุดเจาะอุโมงค์ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างหารือร่วมกับ กปน. เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

#### การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)



ผลการเบิกจ่าย 3,478 ลบ.

**51%**

ต่ำกว่าแผน 3,384 ลบ.

##### โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

กทท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล : กทท. อยู่ระหว่างหารือกับผู้รับจ้างเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นมีความลึกไม่เพียงพอต่อการนำเรือขุดเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และ 2) งานส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค : กทท. รพท. และสำนักงานประมาณเพื่อสันติ (ปส.) ได้ร่วมกันหารือแนวทางการก่อสร้างสะพานยกระดับ ที่มีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้เคียงกับแนวรกรงไฟ และพื้นที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เพื่อตรวจสอบตู้สินค้า ซึ่งมีการปล่อยรังสีจากเครื่องเอกซเรย์และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการโดยเบื้องต้น กทท. ได้ขอให้ ปส. เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปล่อยรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ ซึ่ง กทท. คาดว่า ปส. จะตรวจสอบแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 69 ทั้งนี้ หากไม่มีผลกระทบด้านความปลอดภัย คาดว่าผู้รับจ้างจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือน ก.ย. 69

#### บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)



ผลการเบิกจ่าย 508 ลบ.

**51%**

ต่ำกว่าแผน 491 ลบ.

##### โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โดยเปลี่ยน HRSG และ Steam Turbine เครื่องใหม่ ทดแทนเครื่องเดิม (Revamp Project)

DCAP มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดยกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเสนอโครงการฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อลงนามหนังสือถึง สลค. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณามุมิตำเนินโครงการฯ ต่อไป

#### การเคหะแห่งชาติ (กคช.)



ผลการเบิกจ่าย 283 ลบ.

**58%**

ต่ำกว่าแผน 207 ลบ.

##### โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3

กคช. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากงานก่อสร้างอาคาร C1 เกิดความล่าช้า จากการที่ กคช. ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 69 เพื่อทบทวน TORs ให้มีความรัดกุมและเพิ่มความปลอดภัยด้านการก่อสร้างให้มากยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 69 กคช. ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างอีกครั้ง เพื่อทบทวนราคากลางค่าก่อสร้างและประมาณการต้นทุนโครงการใหม่ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย กคช. ทบทวนราคากลางแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.ย. 69

#### องค์การถ่านหิน (อก.)



ผลการเบิกจ่าย 66 ลบ.

**66%**

ต่ำกว่าแผน 34 ลบ.

##### โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสี ระยะที่ 2

อก. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก อก. ตรวจรับงานการติดตั้งระบบน้ำ ระบบไฟ และเครื่องจักร ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมดให้ อก. ในเดือน ม.ค. 69 เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สัญญาจ้างงานได้ครบกำหนดเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 68 และผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอยกเว้นค่าปรับล่าช้า โดย อก. อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณารยกเว้นหรือลดค่าปรับล่าช้าและจะเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้กับผู้รับจ้างต่อไปภายหลังมีข้อสรุปเรื่องการยกเว้นหรือลดค่าปรับล่าช้า
