


แผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการเงินกู้ที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) จำนวน 113 โครงการ จาก 21 หน่วยงาน วงเงินลงทุนรวม 2,483,144 ลบ. โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 1,215,277 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 49 ของกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

กรอบวงเงินลงทุนตาม มติ ครม. รวม 2,483,144 ล้านบาท



เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569 1,215,277 ล้านบาท

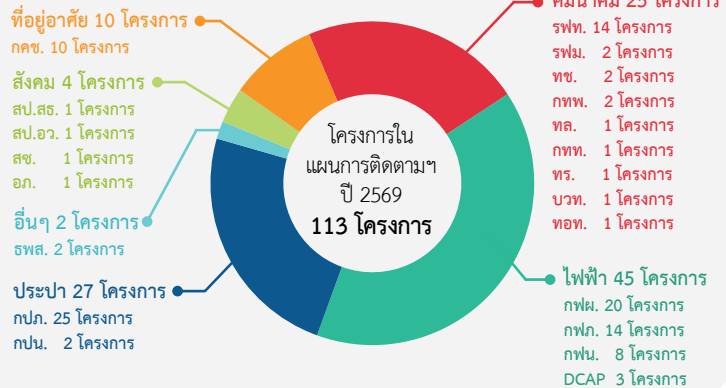

ความเคลื่อนไหวโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2569

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (รฟม.) เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 69 รฟม. ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ใต้) บริเวณหลังหัวเจาะอุโมงค์สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อติดตามและตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การขุดเจาะอุโมงค์ของโครงการฯ ได้นำเทคโนโลยีหัวเจาะอุโมงค์แบบสมดุลแรงดันดินมาใช้งาน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการขุดเจาะพื้นที่ใต้ดินที่มีสภาพเป็นดินเหนียวและชั้นทรายที่มีแรงดันน้ำใต้ดินสูง พร้อมทั้งการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร




โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (กทท.) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 69 นายสรรเพชญ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้ กทท. เร่งหาทางออกเรื่องการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า จากงานถมทะเล เนื่องจากปัญหาความหนาแน่นของดินไม่เป็นไปตามแบบในเอกสารการประกาศประกวดราคา (TOR) และรายละเอียดสัญญาที่มีความคลาดเคลื่อน ซึ่งต้องพิจารณาข้อกฎหมายให้ละเอียดและรอบคอบ




แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ พ.ศ. 2569

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2569

- แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 184,457 ล้านบาท
- แผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - เม.ย. 69 121,975 ล้านบาท
- ผลการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 - เม.ย. 69 63,538 ล้านบาท




แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกรายเดือน

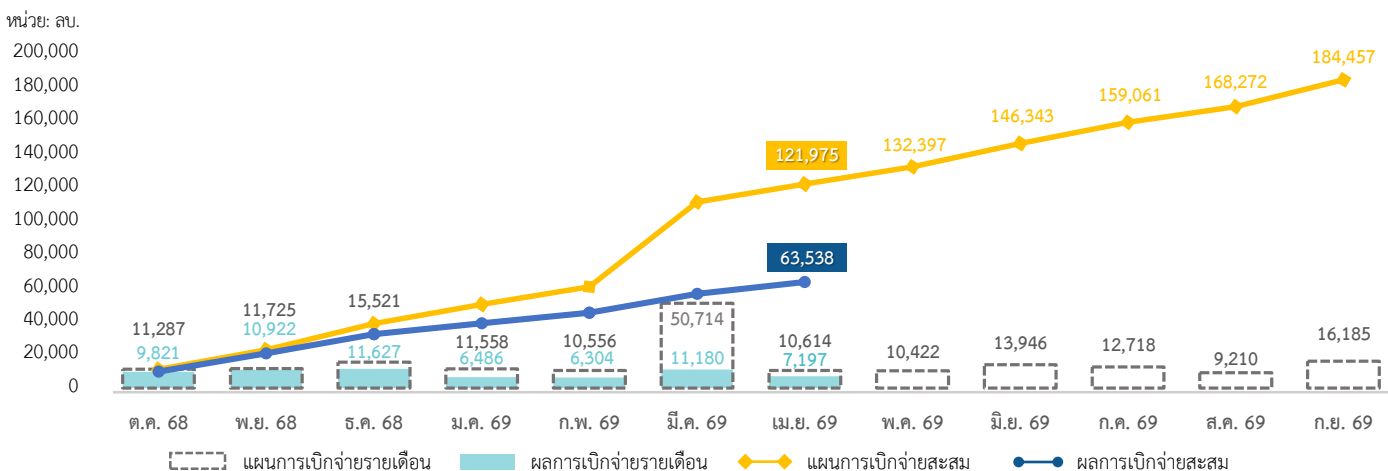

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามแหล่งเงิน


LOAN เงินกู้ มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – เม.ย. 69 สูงสุด 107,135 ลบ. เบิกจ่ายได้ 34% ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – เม.ย. 69

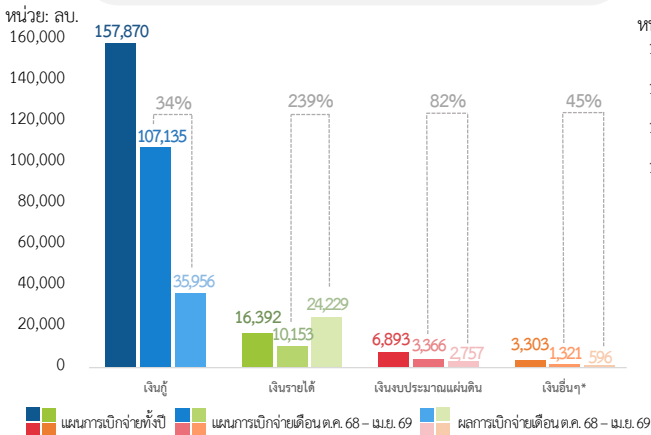

หมายเหตุ: *เงินอื่นๆ หมายถึง เงินกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF)


แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามสาขาการลงทุน

คมนาคม มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – เม.ย. 69 สูงสุด 98,230 ลบ. เบิกจ่ายได้ 40% ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – เม.ย. 69

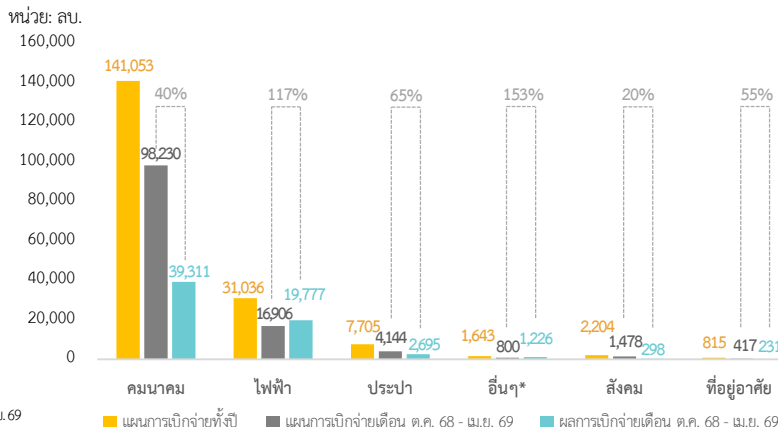

หมายเหตุ: *สาขาอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ธารจักร์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของโครงการ

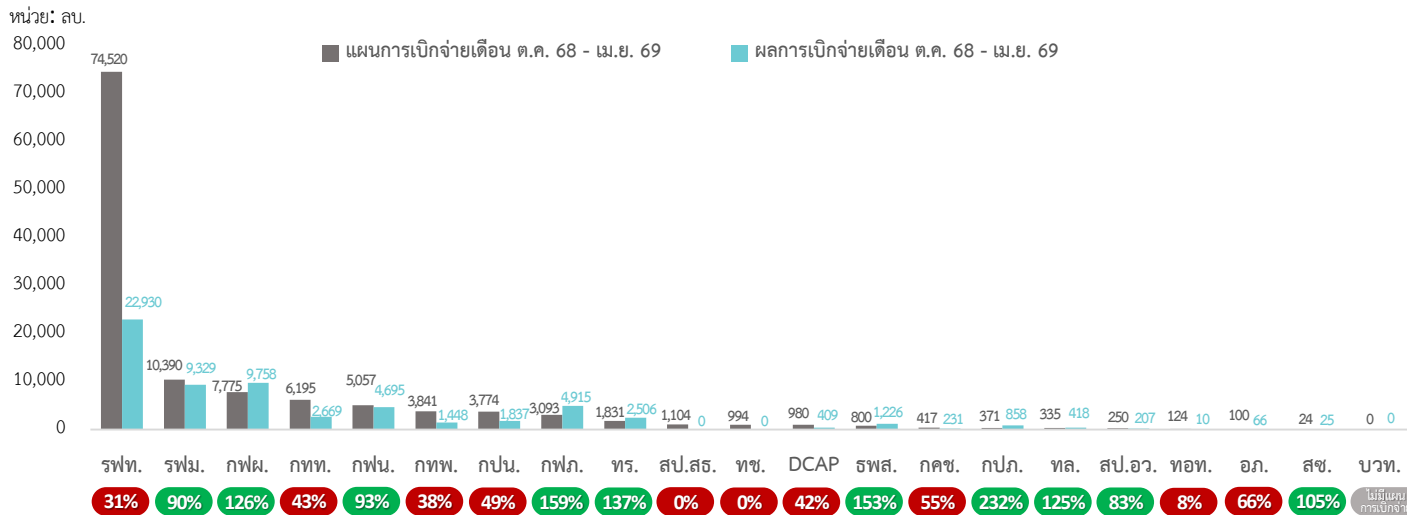

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน สูงกว่า แผนการเบิกจ่ายเงิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)



ผลการเบิกจ่าย 858 ลบ.
232%
สูงกว่าแผน 488 ลบ.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครศรีธรรมราช อ.พระพรหม – ร่อนพิบูลย์ – เมืองนครศรีธรรมราช – เฉลิมพระเกียรติ – เชียงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้รับจ้างเร่งรัดงานวางท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 4103 และหมายเลข 403

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ผลการเบิกจ่าย 4,915 ลบ.
159%
สูงกว่าแผน 1,822 ลบ.

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)
กฟภ. เร่งรัดการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่และการก่อสร้างส่งได้ดินสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **สูงกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)



ผลการเบิกจ่าย 1,226 ลบ.
153%
สูงกว่าแผน 426 ลบ.

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ธพส. เสร็จงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัวพร้อมประกอบและติดตั้งและงานก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ โดย ธพส. ส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานแล้วเสร็จทั้ง 17 หน่วยงานแล้ว ทั้งนี้ โครงการยังเหลืองานตกแต่งภายในอาคารของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ย้ายเข้าพื้นที่ จำนวน 4 หน่วยงาน และงานปรับปรุงพื้นที่อาคาร B ซึ่ง ธพส. คาดว่างานทั้งหมดจะแล้วเสร็จและปิดโครงการได้ภายในเดือน ก.ย. 69

กองทัพเรือ (ทร.)



ผลการเบิกจ่าย 2,506 ลบ.
137%
สูงกว่าแผน 675 ลบ.

โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2) ทร. เสร็จการรื้อย้ายสิ่งก่อสร้างเดิม ซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ภายนอกเขตการบิน คาดว่าจะรื้อย้ายแล้วเสร็จเดือน พ.ศ. 69 และ 2) พื้นที่ภายในเขตการบิน คาดว่าจะรื้อย้ายแล้วเสร็จเดือน พ.ย. 69

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)



ผลการเบิกจ่าย 9,758 ลบ.
126%
สูงกว่าแผน 1,983 ลบ.

โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 คู่สัญญาของ กฟผ. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางละมุงและงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมภูมิพลได้เร็วกว่าแผน

กรมทางหลวง (ทล.)



ผลการเบิกจ่าย 418 ลบ.
124%
สูงกว่าแผน 83 ลบ.

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ผู้รับจ้างได้เริ่มงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยอยู่ระหว่างทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง อาทิ คอนกรีต เหล็กเสริม และเจาะเสาเข็มเพื่อทำฐานรากคอนกรีต รวมทั้งหล่อคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานสะพาน (Segments) นอกจากนี้ ทล. ได้รื้อย้ายสิ่งกีดขวาง ลางป่า ปรับพื้นที่ระดับดินเพื่อเตรียมเริ่มงานก่อสร้างได้เพิ่มเติม และอยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค อาทิ ท่อประปา ซึ่งกีดขวางแนวพื้นที่ก่อสร้างโครงการบางส่วน เพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวางต่อไป โดยมีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 4.73

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)



ผลการเบิกจ่าย 25 ลบ.
105%
สูงกว่าแผน 1 ลบ.

โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ สซ. เบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับงานด้านระบบสาธารณูปโภค งานออกแบบพัฒนาท่อสุญญากาศอะลูมิเนียม และงานจัดทำแผนรายละเอียดการจัดซื้อ การติดตั้ง และทดสอบเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนทั้งโครงการ

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.)



ผลการเบิกจ่าย 0 ลบ.
0%
ต่ำกว่าแผน 1,104 ลบ.

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สป.สธ. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดย สบ. อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างสัญญาเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างสัญญาเงินกู้ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 69 สป.สธ. ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PISC) สำหรับ 5 โรงพยาบาลแล้ว ซึ่งจะใช้เงินงบประมาณในการดำเนินการ

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)



ผลการเบิกจ่าย 0 ลบ.

0%

ต่ำกว่าแผน 994 ลบ.

โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระเสลิ่ง จังหัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ทช. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดย สน. อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างสัญญาเงินกู้ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขเงินกู้และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างสัญญาเงินกู้ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะลงนามสัญญาเงินกู้ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากนั้น ทช. จึงจะเริ่มเบิกจ่ายเงินตามวงงานเมื่อสัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)



ผลการเบิกจ่าย 10 ลบ.

8%

ต่ำกว่าแผน 114 ลบ.

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ทอท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดยกระทรวงคมนาคมรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ ครม. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋า (BHS) (ขาเข้าและเปลี่ยนเที่ยวบิน) ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ก่อน ทอท. เริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)



ผลการเบิกจ่าย 22,930 ลบ.

31%

ต่ำกว่าแผน 51,590 ลบ.

โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

รฟท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากโครงการล่าช้าสะสมจากการที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้จากปัญหาการเวนคืนที่ดินในพื้นที่กรมป่าไม้และที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งการออกรูปแบบที่กระดาษบาง (ร.ว. 9) และการออกแผนที่แปลงที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม (สร. 5 ก.) รวมทั้งผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ทำให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาแรงงานในประเทศเพื่อเข้ามาก่อสร้างเพิ่มเติม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)



ผลการเบิกจ่าย 1,448 ลบ.

38%

ต่ำกว่าแผน 2,393 ลบ.

โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจุดโชติ-ถนนลำลูกกา)

กทพ. มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน เนื่องจาก กทพ. อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2569 สำหรับงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างและเริ่มก่อสร้างในพื้นที่ของ กทพ. ที่ได้รับอนุญาตแล้ว อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือ กทพ. อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขฉบับที่ความตกลงร่วมกัน (MOU) กับ ทล. และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งคาดว่าจะลงนาม MOU กับ ทล. และ กทม. ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากเดิมไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)



ผลการเบิกจ่าย 409 ลบ.

42%

ต่ำกว่าแผน 571 ลบ.

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โดยเปลี่ยน HRSG และ Steam Turbine เครื่องใหม่ ทดแทนเครื่องเดิม (Revamp Project)

DCAP มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดยกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลโครงการ เพื่อเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการ

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)



ผลการเบิกจ่าย 2,669 ลบ.

43%

ต่ำกว่าแผน 3,526 ลบ.

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

กทท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล : กทท. อยู่ระหว่างหารือกับผู้รับจ้างเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นมีความลึกไม่เพียงพอต่อการนำเรือขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ก่อสร้าง และ 2) งานส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค : กทท. อยู่ระหว่างหารือกับผู้รับจ้างเพื่อปรับแบบงานก่อสร้างสะพานยกระดับเนื่องจากฐานรากสะพานยกระดับทับซ้อนกับแนวรางรถไฟ

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

การประปานครหลวง (กปน.)



ผลการเบิกจ่าย 1,837 ลบ.

48%

ต่ำกว่าแผน 1,936 ลบ.

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

กปน. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด เอกชนเจ้าของพื้นที่ไม่ประสงค์ขายที่ดิน และเสนอราคาขายที่สูงกว่ากรอบเงินรายได้ โดย กปน. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการจัดซื้อที่ดินแห่งใหม่ทดแทนที่ดินเดิม และ 2) งานอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถจัดหาแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างก่อสร้างและเบิกจ่ายตามงวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิ.ย. 69

การเคหะแห่งชาติ (กคช.)



ผลการเบิกจ่าย 231 ลบ.

55%

ต่ำกว่าแผน 186 ลบ.

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3

กคช. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากงานก่อสร้างอาคาร C1 เกิดความล่าช้า จากการที่ กคช. ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 69 เพื่อทบทวนร่างขอบเขตงาน (Term of References : TORs) ให้มีความรัดกุม และเพิ่มความปลอดภัยด้านการก่อสร้างให้มากยิ่งขึ้น โดย กคช. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกำหนดเปิดซองข้อเสนอวันที่ 15 พ.ค. 69 คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาได้ภายในเดือน มิ.ย. 69

องค์การเภสัชกรรม (อก.)



ผลการเบิกจ่าย 66 ลบ.

66%

ต่ำกว่าแผน 34 ลบ.

โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2

อก. มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน เนื่องจาก อก. อยู่ระหว่างการตรวจรับงานการติดตั้งระบบน้ำ ระบบไฟ และเครื่องจักร ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานให้ อก. ครบทั้งหมดแล้วในเดือน ม.ค. 69 หากการตรวจรับงานเสร็จสิ้น อก. จะทยอยเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป
