



แผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการเงินกู้ที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) จำนวน 113 โครงการ จาก 21 หน่วยงาน วงเงินลงทุนรวม 2,483,144 ลบ. โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2569 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 1,255,569 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 51 ของกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

กรอบวงเงินลงทุนตาม มติ ครม. รวม 2,483,144 ล้านบาท



เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2569 1,255,569 ล้านบาท

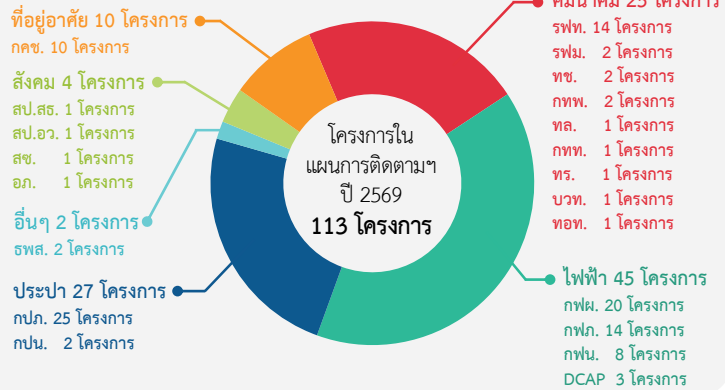

ความเคลื่อนไหวโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำเดือนสิงหาคม 2569

แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน (กฟน.) การออกจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของ กฟน. พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 - 7 และ 10 ส.ค. 69 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเป็นพันธบัตรที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน อายุ 5 ปี วงเงินออกจำหน่ายรวม 2,000 ลบ. ซึ่ง กฟน. จะนำไปใช้ในโครงการฯ เพื่อยกระดับความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า ลดความเสี่ยงจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยและภูมิทัศน์ที่สวยงาม



โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ (สช.) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 69 คณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย สบน. สช. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงการต่างประเทศ ได้เจรจาสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงนามในสัญญาเงินกู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป



แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ พ.ศ. 2569


ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2569

แผนการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	184,457	ล้านบาท
แผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – ส.ค. 69	168,272	ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – ส.ค. 69	103,830	ล้านบาท

62% ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – ส.ค. 69


56% ของแผนการเบิกจ่ายทั้งปี

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกรายเดือน

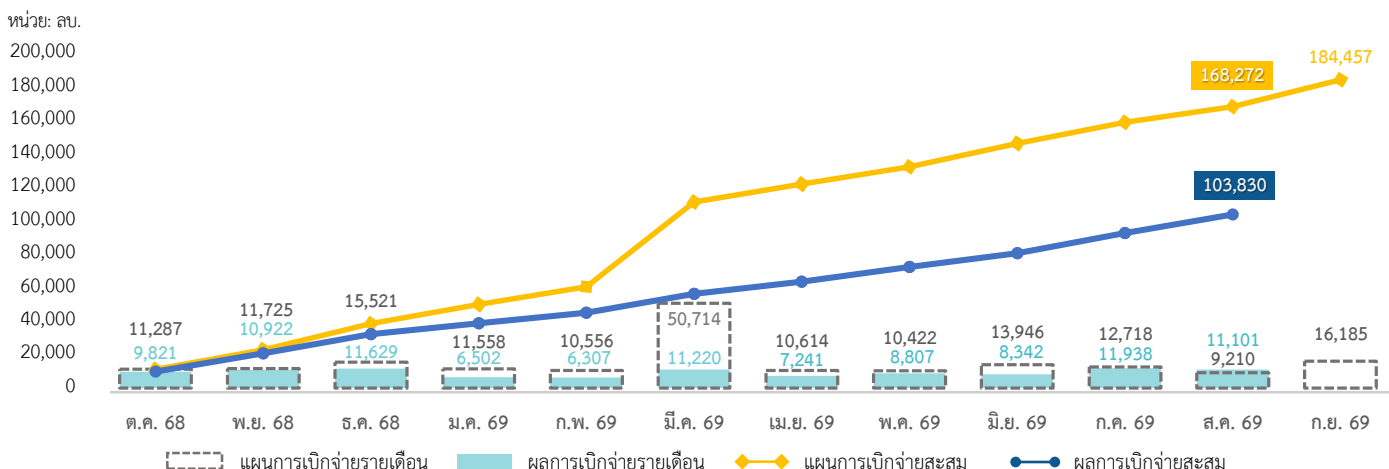


แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามแหล่งเงิน

เงินกู้ มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – ส.ค. 69 สูงสุด **143,935** ลบ. เบิกจ่ายได้ **49%** ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – ส.ค. 69

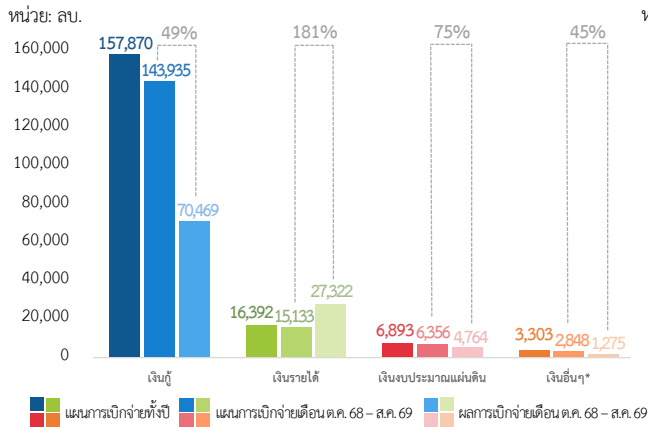


แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามสาขาการลงทุน

คมนาคม มีแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – ส.ค. 69 สูงสุด **130,183** ลบ. เบิกจ่ายได้ **51%** ของแผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 68 – ส.ค. 69

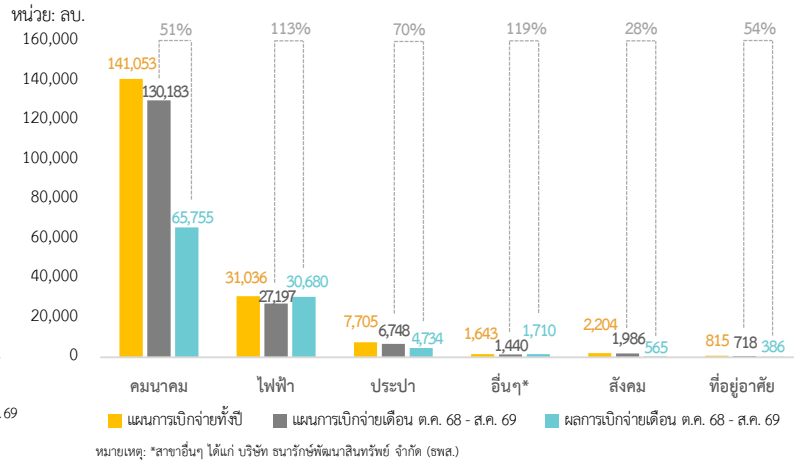

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามหน่วยงานเจ้าของโครงการ

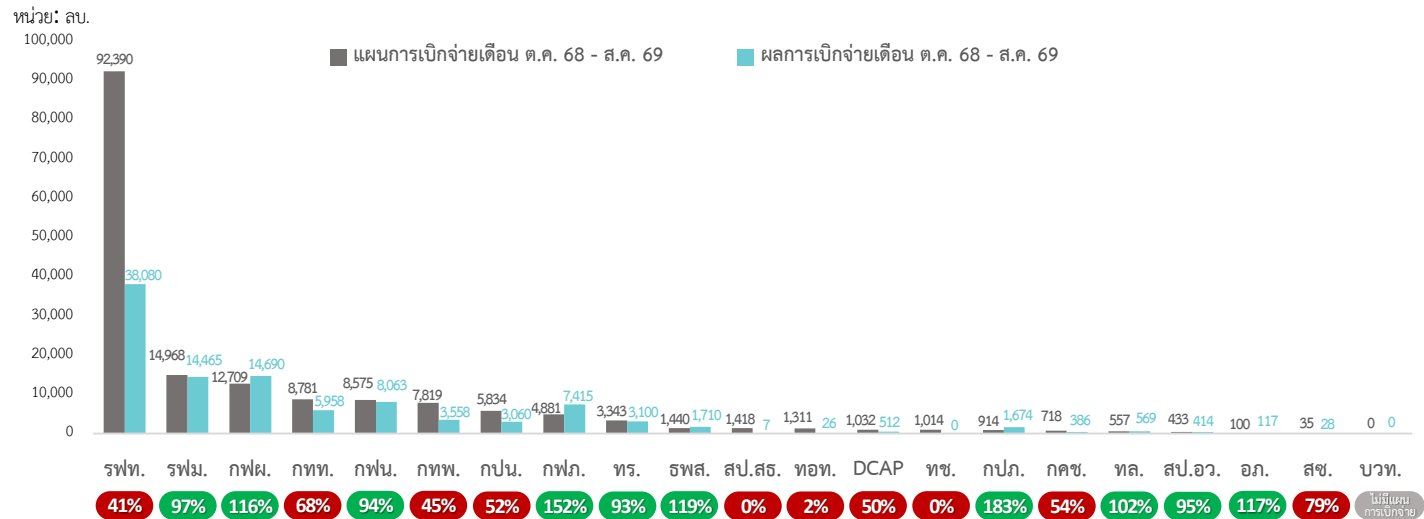

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน สูงกว่า แผนการเบิกจ่าย

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)



ผลการเบิกจ่าย 1,674 ลบ.
183%
สูงกว่าแผน 761 ลบ.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาโรงลิต อำเภอธัญบุรี – ลำลูกกา – คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กปภ. เร่งรัดงานระยะที่ 1 ดังนี้ 1) งานส่วน 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 69 และ กปภ. เบิกจ่ายค่างานก่อสร้างงวดสุดท้ายและค่าประกันผลงานให้ผู้รับจ้างแล้วเสร็จ และ 2) งานส่วน 3 ผู้รับจ้างเร่งรัดงานวางท่อบริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)



ผลการเบิกจ่าย 7,415 ลบ.
152%
สูงกว่าแผน 2,534 ลบ.

โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 3 (คพม.3)
กฟภ. เร่งรัดจัดหาวสดุและอุปกรณ์ และจัดสรรค่าใช้จ่ายให้กับ กฟภ. พื้นที่ โดย กฟภ. ได้อนุมัติขยายเขตราษฎรรายใหม่ 10,448 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันติดตั้งมิเตอร์แล้วเสร็จ 890 ครัวเรือน

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **สูงกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)



ผลการเบิกจ่าย 1,710 ลบ.

119%

สูงกว่าแผน 270 ลบ.

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ธพส. เสร็จสร้างก่อนส่งมอบตงภายในอาคารแล้วเสร็จเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน จาก 3 หน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และเร่งรัดงานซื้อขายครุภัณฑ์รถยนต์พร้อมประกอบและติดตั้งที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จทั้ง 3 หน่วยงาน โดยมี 14 หน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเข้าใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว จาก 17 หน่วยงาน ทั้งนี้ โครงการยังเหลืองานปรับปรุงพื้นที่อาคาร B ซึ่ง ธพส. คาดว่างานทั้งหมดจะแล้วเสร็จและปิดโครงการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์การเภสัชกรรม (อก.)



ผลการเบิกจ่าย 117 ลบ.

117%

สูงกว่าแผน 17 ลบ.

โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2

อก. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างและที่ปรึกษาควบคุมงาน โดย อก. ตรวจสอบงานระบบสนับสนุนอาคารภายในโรงงาน เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น และงานติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงาน ซึ่งผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมดให้ อก. ในเดือน ม.ค. 69 เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สัญญาจ้างงานได้ครบกำหนดเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 68 และผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอยกเว้นค่าปรับล่าช้า โดย อก. คาดว่าจะสามารถหาข้อสรุปเรื่องการยกเว้นหรือลดค่าปรับก่อสร้างล่าช้าของผู้รับจ้างได้ภายในเดือน ธ.ค. 69 จากเดิมภายในเดือน ก.ย. 69 และจะเบิกจ่ายเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ผู้รับจ้างต่อไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)



ผลการเบิกจ่าย 14,690 ลบ.

116%

สูงกว่าแผน 1,980 ลบ.

โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

กฟผ. เบิกจ่ายค่าทดแทนสิทธิการใช้ที่ดินของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 kV ไทรน้อย - แจ้งวัฒนะ ได้เร็วกว่าแผน

กรมทางหลวง (ทล.)



ผลการเบิกจ่าย 569 ลบ.

102%

สูงกว่าแผน 12 ลบ.

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

ทล. เร่งรัดงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความพร้อมได้เพิ่มเติม รวมทั้งสามารถรื้อย้ายสิ่งกีดขวางเดิมที่อยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ เสาไฟฟ้าสองส่ว และราวเหล็กกันรั้ว เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างใหม่ได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ทล. ยังคงพบอุปสรรคหน้างานจากการรื้อย้ายสิ่งกีดขวางในพื้นที่ก่อสร้างจากงานสาธารณูปโภคอื่น อาทิ ท่อประปา กีดขวางบริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ซึ่งเป็นแนวพื้นที่ก่อสร้างของโครงการที่ ทล. จะต้องปรับปรุงทาง ในกรณีนี้ ทล. อยู่ระหว่างเร่งรัดการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคเพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวางต่อไป โดยมีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 14.67

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)



ผลการเบิกจ่าย 0 ลบ.

0%

ต่ำกว่าแผน 1,014 ลบ.

โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ทช. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย โดยกระทรวงการคลังลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารโลก (The World Bank: WB) เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 69 และ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 69 รับทราบผลการลงนามสัญญาเงินกู้และข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก WB และมีการประกาศผลการกู้เงินในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 69 โดย สบ. จะขอความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion) จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และรวบรวมส่งให้ WB ประทศการพิจารณาเพื่อให้สัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ทช. ได้ลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 69 และจะเริ่มเบิกจ่ายเงินตามงวดงานเมื่อสัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สปล.สธ.)



ผลการเบิกจ่าย 7 ลบ.

0%

ต่ำกว่าแผน 1,411 ลบ.

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

สปล.สธ. มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน โดย สบ. เสนอร่างสัญญาเงินกู้ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อเสนอให้ ครม. พิจารณานุมัติเงื่อนไขเงินกู้และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างสัญญาเงินกู้แล้ว คาดว่า ครม. จะพิจารณานุมัติและลงนามสัญญาเงินกู้ได้ภายในเดือน ก.ย. 69 ทั้งนี้ สปล.สธ. อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการประกวดราคาสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (CSC) คาดว่าจะประกาศประกวดราคาในเดือน ก.ย. 69 นอกจากนี้ ทั้ง 5 โรงพยาบาลได้ประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างสำหรับงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลแล้ว คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ต.ค. 69

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)



ผลการเบิกจ่าย 26 ลบ.

2%

ต่ำกว่าแผน 1,285 ลบ.

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560)

ทอท. มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) ได้เสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้าง ส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกและงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบลำเลียงกระเป๋า (BHS) (ขาเข้าและเปลี่ยนเที่ยวบิน) ถึง สลค. แล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 69 โดย สลค. อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการนำเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบเรื่องดังกล่าว ก่อน ทอท. เริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)



ผลการเบิกจ่าย 38,080 ลบ.

41%

ต่ำกว่าแผน 54,311 ลบ.

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) รฟท. มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานก่อสร้างโยธา รฟท. อยู่ระหว่างตรวจรับและจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ซึ่ง รฟท. คาดว่าจะเบิกจ่ายค่างานก่อสร้างโยธาในเดือน ก.ย. 69 และ 2) งานออกแบบรายละเอียดงานวางราง งานระบบรถไฟและเครื่องกล (Detailed Design) ผู้รับจ้างฝ่ายจีนยังส่งมอบงานไม่ครบถ้วน ซึ่ง รฟท. คาดว่า จะเบิกจ่ายค่างาน Detailed Design ในเดือน ม.ค. 70

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)



ผลการเบิกจ่าย 3,558 ลบ.

45%

ต่ำกว่าแผน 4,262 ลบ.

โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง

กทพ. มีผลเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) กทพ. อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อส่งมอบพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ม.ค. 70 จากเดิมภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ 2) กทพ. อยู่ระหว่างเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการ ได้แก่ (1) กรอบวงเงินและแหล่งเงินของโครงการ (2) โครงสร้างค่าผ่านทางในภาพรวมของโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตทั้ง 2 ระยะ และ (3) การแก้ไขแบบก่อสร้างอุโมงค์ให้มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้านธรณีวิทยา ต่อ ครม. โดย กทพ. ได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยัง คค. แล้วเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 69 และ คค. อยู่ระหว่างเตรียมสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเสนอให้ ครม. พิจารณาดำเนินขั้นตอนต่อไป

บริษัท ไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP)



ผลการเบิกจ่าย 512 ลบ.

50%

ต่ำกว่าแผน 520 ลบ.

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โดยเปลี่ยน HRSG และ Steam Turbine เครื่องใหม่ ทดแทนเครื่องเดิม (Revamp Project)

DCAP มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน โดยกระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่องขออนุมัติโครงการฯ ต่อ สลค. แล้วเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 69 และ สลค. อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ตามขั้นตอนต่อไป

การประปานครหลวง (กปน.)



ผลการเบิกจ่าย 3,060 ลบ.

52%

ต่ำกว่าแผน 2,774 ลบ.

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

กปน. มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำบางมด เอกชนเจ้าของพื้นที่ไม่ประสงค์ขายที่ดิน และเสนอราคาขายที่สูงกว่ากรอบเงินรายได้ โดย กปน. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการจัดซื้อที่ดินแห่งใหม่ทดแทนที่ดินเดิม และ 2) งานอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ ผู้รับจ้างประสบปัญหาน้ำและทรายไหลเข้าบ่อในขั้นตอนการขุดเจาะอุโมงค์ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยผู้รับจ้างและ กปน. อยู่ระหว่างหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะก่อสร้างภายหลังหารือแนวทางแล้วเสร็จต่อไป

การเคหะแห่งชาติ (กคช.)



ผลการเบิกจ่าย 386 ลบ.

54%

ต่ำกว่าแผน 332 ลบ.

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3

กคช. มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากงานก่อสร้างอาคาร C1 เกิดความล่าช้า จากการที่ กคช. ได้ยกเลิกประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 69 เพื่อทบทวนราคากลางค่าก่อสร้างและประมาณการต้นทุนโครงการใหม่ ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดย กคช. ได้ผลผู้ชนะงานก่อสร้างแล้ว และอยู่ระหว่างรออนำเสนอคณะกรรมการ กคช. ให้ความเห็นชอบก่อนลงนามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ กคช. อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการ กคช. ก่อนจะเสนอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเสนอ ครม. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ กคช. ต่อไป

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่ายเงิน

การทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)



ผลการเบิกจ่าย 5,958 ลบ.

68%

ต่ำกว่าแผน 2,823 ลบ.

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

กทท. มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1) งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล : กทท. อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้างเชื่อมกันคลื่นมีความลึกไม่เพียงพอต่อการนำเรือขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ก่อสร้าง และ 2) งานส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค : การก่อสร้างสะพานยกระดับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับแนวรางรถไฟและพื้นที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เพื่อตรวจสอบตู้สินค้ามีการปล่อยรังสีจากเครื่องเอกซเรย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ ผู้รับจ้างได้จ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจการปล่อยรังสีในพื้นที่และส่งผลการตรวจสอบให้ กทท. แล้ว โดย กทท. อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารถึงกรมศุลกากรและสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อขอความเห็นชอบผลการตรวจดังกล่าวก่อนเริ่มก่อสร้างสะพานยกระดับต่อไป

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สช.)



ผลการเบิกจ่าย 28 ลบ.

79%

ต่ำกว่าแผน 7 ลบ.

โครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ

สช. มีผลการเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผน โดยเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 69 คณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย สบ. สช. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงการต่างประเทศ ได้เจรจาสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) โดยปัจจุบัน สบ. อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเสนอร่างสัญญาเงินกู้ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติเงื่อนไขเงินกู้และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในร่างสัญญาเงินกู้ต่อไป
