



โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้และอยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2563 มีทั้งสิ้น 130 โครงการ 2 แผนงาน ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนา จำนวน 130 โครงการ 2) แผนงานเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (20 โครงการย่อย) และ 3) แผนงานเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (4 โครงการย่อย) มีกรอบเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1,907,513.21 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนแล้ว 836,111.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของกรอบเงินตามมติ ครม.

**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน** โครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 มีวงเงิน 171,255.35 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น เงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) ร้อยละ 81 เงินรายได้ ร้อยละ 16 และเงินงบประมาณ ร้อยละ 3 ตามแผนภาพที่ 1 โดยเป็นประมาณการเบิกจ่ายในสาขาคมนาคมเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา คือ สาขาไฟฟ้า และสาขาประปา คิดเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 4 ตามลำดับ ตามแผนภาพที่ 2

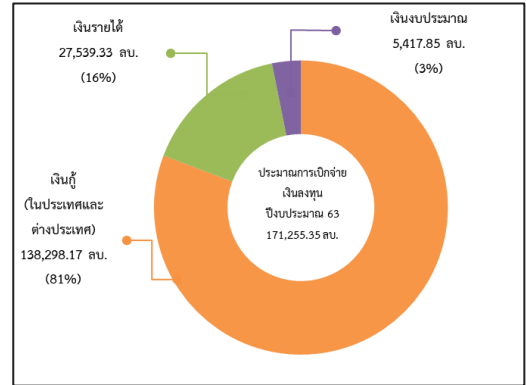


แผนภาพที่ 1: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน

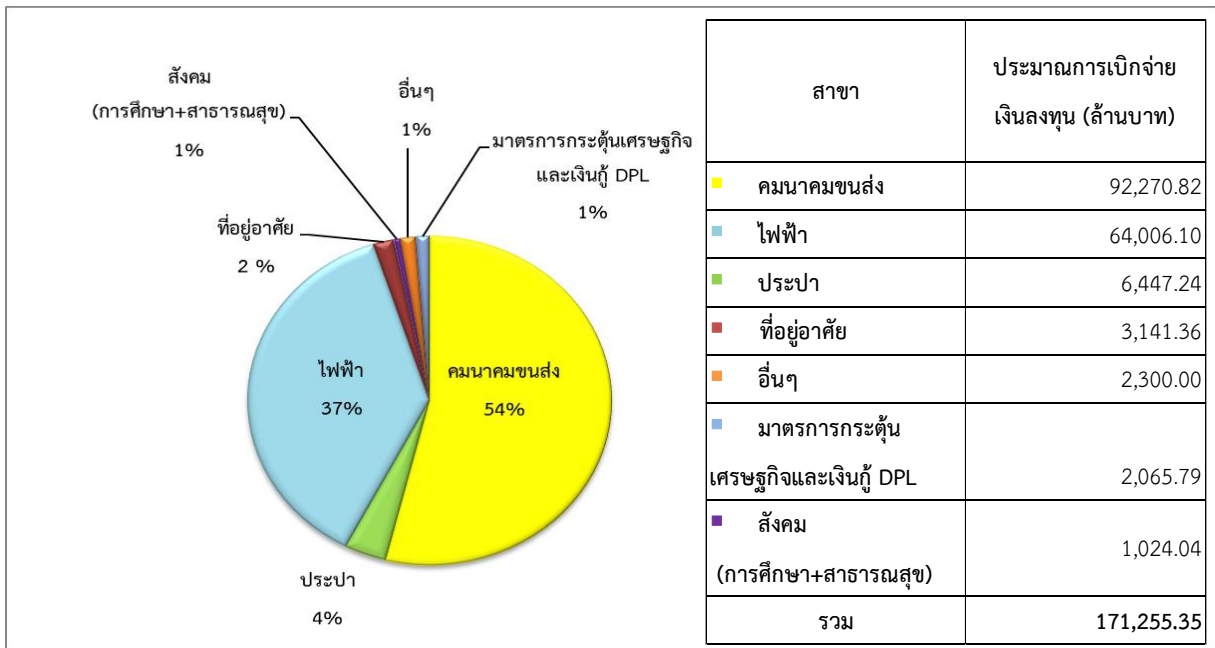

แผนภาพที่ 2 : ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามสาขาลงทุน


เมื่อพิจารณาประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนปีงบประมาณ 2563 แยกรายหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พบว่าหน่วยงานที่มีประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 64,551.55 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 22,185.38 ล้านบาท และการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) 21,866.63 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 3

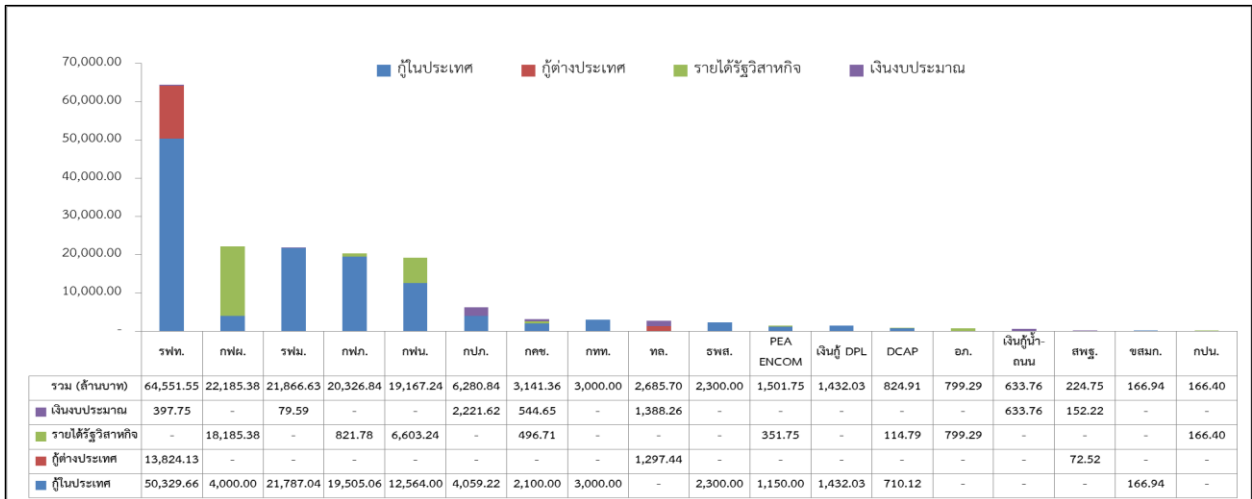

แผนภาพที่ 3: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามหน่วยงาน

### ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน


ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมของปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 48,653.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.41 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสมทั้งปี (171,255.35 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม 5 เดือนแรก (ต.ค. 62 – ก.พ. 63) ของปีงบประมาณ 2563 (61,756.21 ล้านบาท)

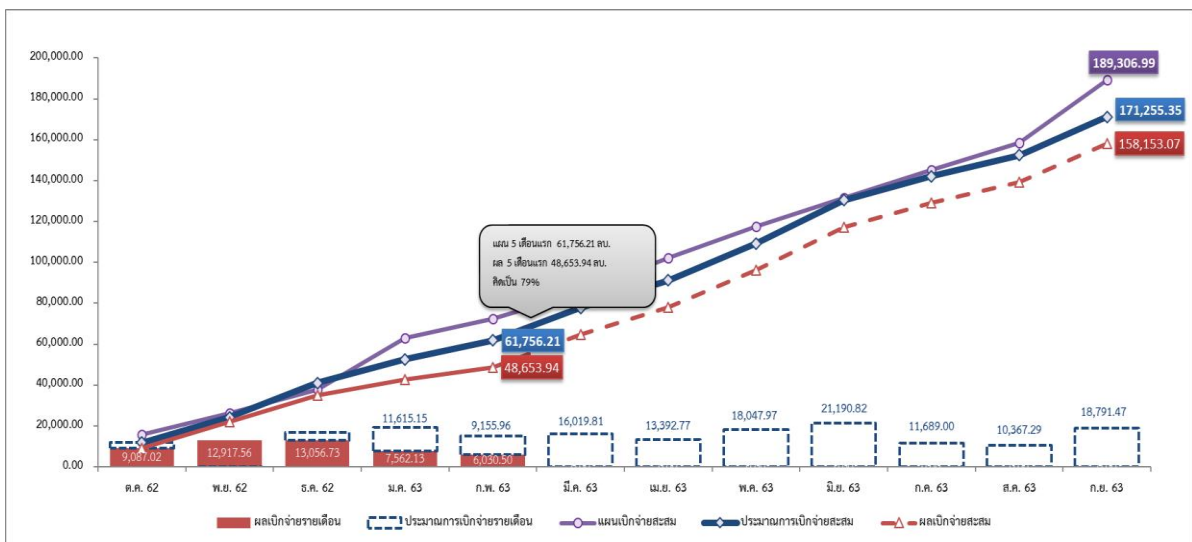

แผนภาพที่ 4: ประมาณการเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกรายเดือน

เมื่อแบ่งผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนตามแผนภาพที่ 4 จะเห็นว่ามี การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 62) จำนวน 35,061.31 ล้านบาท เดือนมกราคม 2563 จำนวน 7,562.13 ล้านบาท และเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6,030.50 ล้านบาท และในช่วง 7 เดือนที่เหลือ (มี.ค. – ก.ย. 63) หากหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน คาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 จะมีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนทั้งสิ้น 158,153.07 ล้านบาท


ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม จำนวน 48,653.94 ล้านบาท ประกอบด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม จำนวน 24,913.71 ล้านบาท (ร้อยละ 51) เงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) สะสม จำนวน 23,156.34 ล้านบาท (ร้อยละ 48) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 583.89 ล้านบาท (ร้อยละ 1) ตามแผนภาพที่ 5

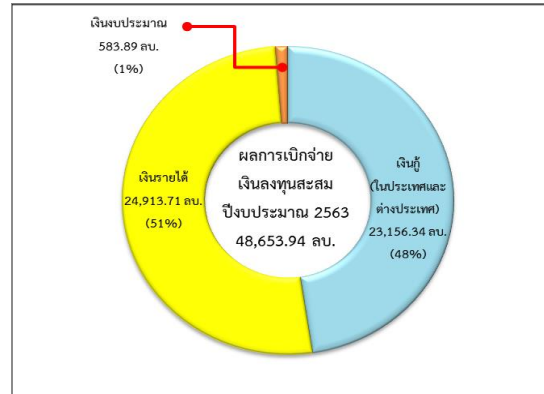

แผนภาพที่ 5: ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน

### เปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563

การเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 รายหน่วยงาน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามแผนภาพที่ 6

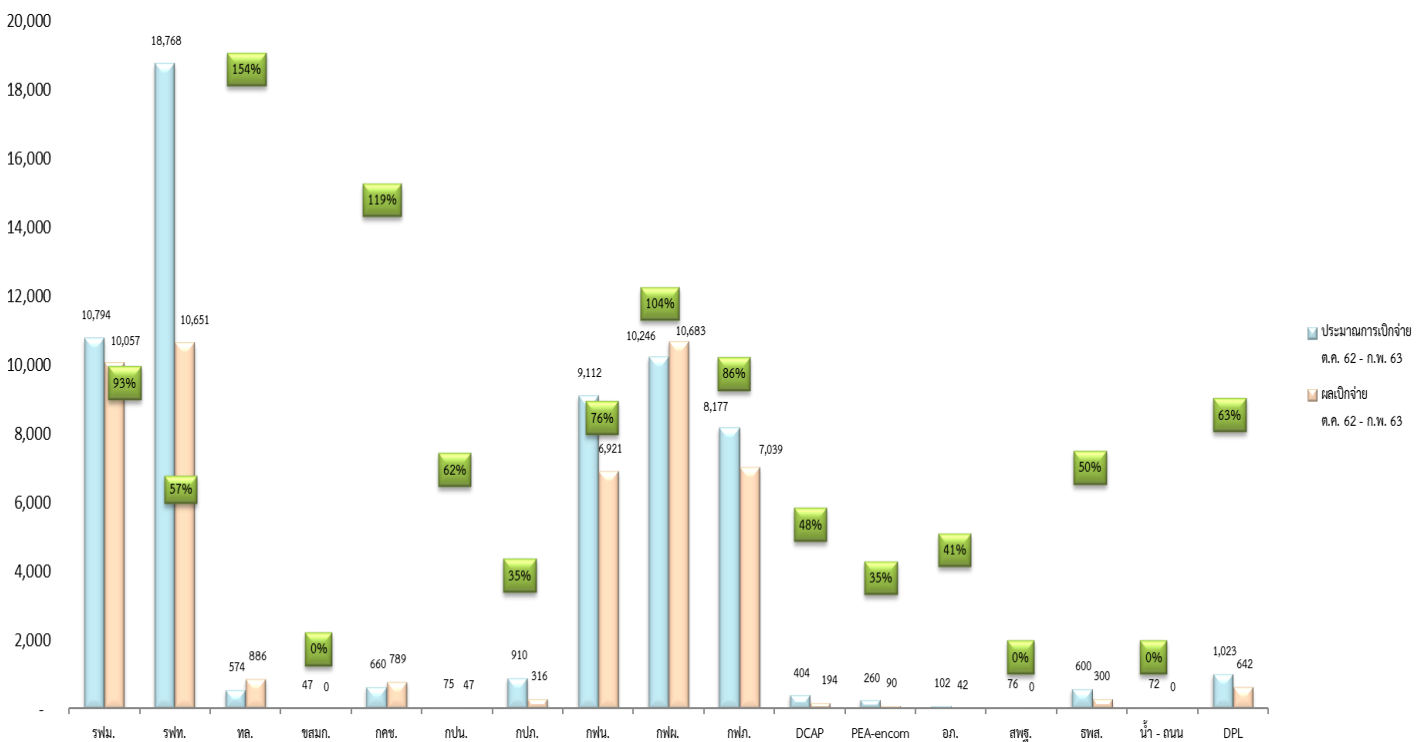

แผนภาพที่ 6: ประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 แยกตามหน่วยงาน

เมื่อเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐสะสม ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานได้ ดังนี้ 1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน 2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนต่ำกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน และ 3) หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน**สูงกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ประกอบด้วย (1) กรมทางหลวง (ทล.) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนร้อยละ 154 ของประมาณการเบิกจ่าย แม้ว่า ทล. จะมีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสมก็ตามแต่ตัวเลขไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานจริง เนื่องจาก ทล. บันทึกรายประมาณการเบิกจ่ายทุกๆ 2 เดือน แต่เบิกจ่ายจริงทุกเดือน ซึ่งในภาพรวมการดำเนินงานจะเป็นไปตามแผน แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นรายงานสำหรับเดือนที่ ทล. ไม่ได้บันทึกประมาณการเบิกจ่ายจะทำให้ตัวเลขผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสม และ (2) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนร้อยละ 119 ของประมาณการเบิกจ่าย แม้ว่า กคช. มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสมก็ตาม แต่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนจริงเนื่องจากที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการ เช่น โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 57 และ 58 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 2 ระยะที่ 1 เป็นต้น เกิดความล่าช้าสะสมมาจากปีงบประมาณ 2562 ทำให้ต้องเร่งรัดการก่อสร้างโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินสูงกว่าแผนการเบิกจ่าย

2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน**ต่ำกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ประกอบด้วย (1) รพท. มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนร้อยละ 57 ของประมาณการเบิกจ่าย เนื่องจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน งานโยธาช่วงกลางดง-ปางอโศก และช่วงสีคิ้ว-คูคต ก่อสร้างล่าช้า และโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายค่างานงวดสุดท้าย (2) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนร้อยละ 48 ของประมาณการเบิกจ่าย เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1 และโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 KV ไปยังสวีตีย์เกียร์ (GIS) ของสถานีไฟฟ้าย่อย DCAP 2 เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงผลิตน้ำเย็นโดยการซื้อไฟฟ้ามาใช้เอง เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของ COVID - 19 บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงชะลอการเชื่อมต่อระบบจ่ายน้ำและระบบไฟฟ้ากับอาคาร SAT-1 ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน และเลื่อนการเปิดอาคาร SAT-1 จากปลายปี 2563 เป็นเดือนเมษายน 2564 (3) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนร้อยละ 41 ของประมาณการเบิกจ่าย เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง องค์การเภสัชกรรม อ.ฉะบู่ จ.ปทุมธานี เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้างโครงการ (4) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนร้อยละ 35 ของประมาณการเบิกจ่าย เนื่องจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. จังหวัดต่างๆ เช่น สาขาขอนแก่น และสาขาปทุมธานี เกิดความล่าช้า และส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการได้ ประกอบกับบางโครงการยังอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบการก่อสร้าง

3) หน่วยงานที่**ไม่มีผลการเบิกจ่าย**เงินลงทุน ประกอบด้วย (1) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เนื่องจาก ขสมก. ได้ปรับปรุงแผนฟื้นฟูฉบับใหม่โดยเปลี่ยนโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้าเป็นจ้างเอกชนเดินรถแทน ซึ่งต้องรอให้ ครม. อนุมัติแผนฟื้นฟูดังกล่าวก่อน และจะขอลอนโครงการจัดซื้อรถไฟฟ้าจำนวน 35 คัน และโครงการจัดหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน 1 สถานี ออกจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค เพิ่งจะสามารถลงนามในสัญญาเงินกู้กับ JICA ได้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งล่าช้ากว่าแผน ประกอบกับเงินงบประมาณปี 2563 เพิ่งมีการประกาศใช้จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
