



โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้และอยู่ระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2563 มีทั้งสิ้น 131 โครงการ 2 แผนงาน ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนา จำนวน 131 โครงการ 2) แผนงานเงินกู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (20 โครงการย่อย) และ 3) แผนงานเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (4 โครงการย่อย) มีกรอบเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 1,922,171.45 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 มีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนแล้ว 891,361.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.37 ของกรอบเงินตามมติ ครม.

ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน โครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 มีวงเงิน 172,239.72 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) ร้อยละ 81 เงินรายได้ ร้อยละ 16 และเงินงบประมาณ ร้อยละ 3 ตามแผนภาพที่ 1

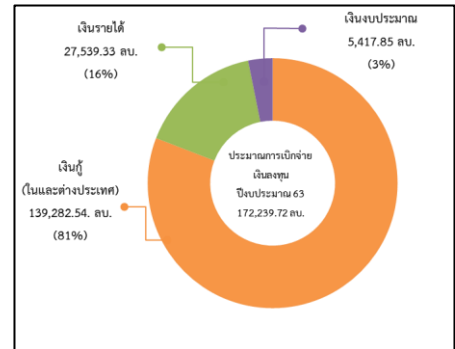


โดยเป็นประมาณการเบิกจ่ายในสาขาคมนาคมเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา คือ สาขาไฟฟ้า และสาขาประปา คิดเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 4 ตามลำดับ ตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 1: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน

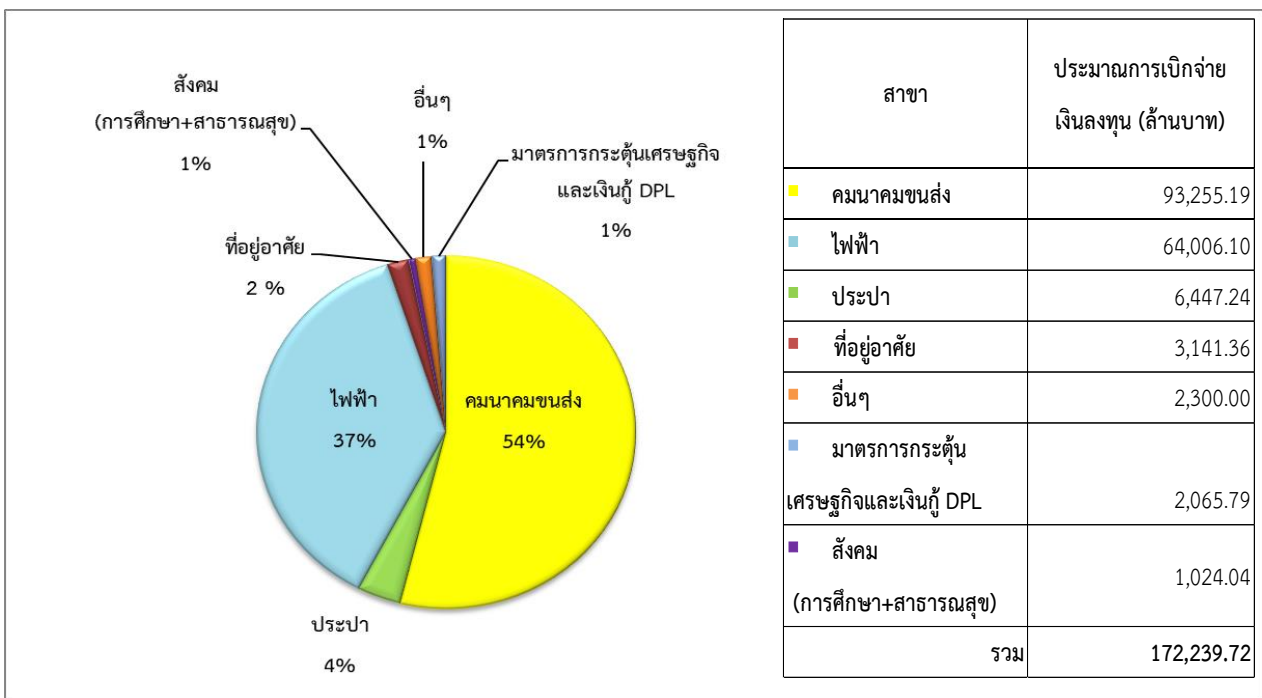

แผนภาพที่ 2 : ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามสาขาลงทุน


เมื่อพิจารณาประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนปีงบประมาณ 2563 แยกรายหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พบว่าหน่วยงานที่มีประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 65,535.92 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 22,185.38 ล้านบาท และการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) 21,866.63 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 3

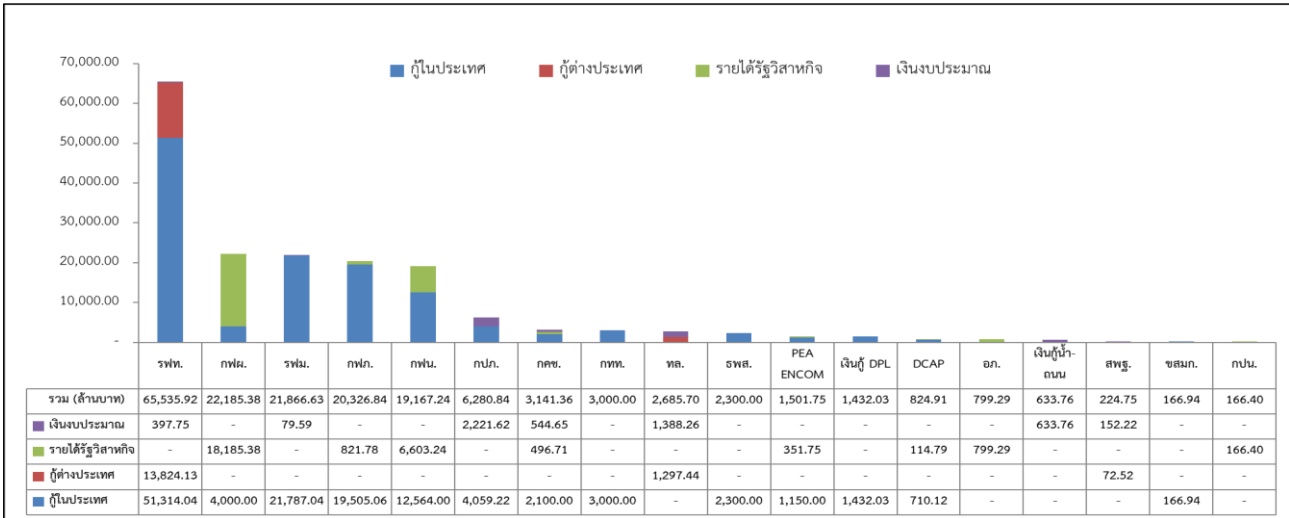

แผนภาพที่ 3: ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามหน่วยงาน

ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน


ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 (รอบ 9 เดือน) มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมของปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 93,327.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.18 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสมทั้งปี (172,239.72 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 71.57 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม 9 เดือนแรก (ต.ค. 62 – มิ.ย. 63) ของปีงบประมาณ 2563 (130,407.59 ล้านบาท)

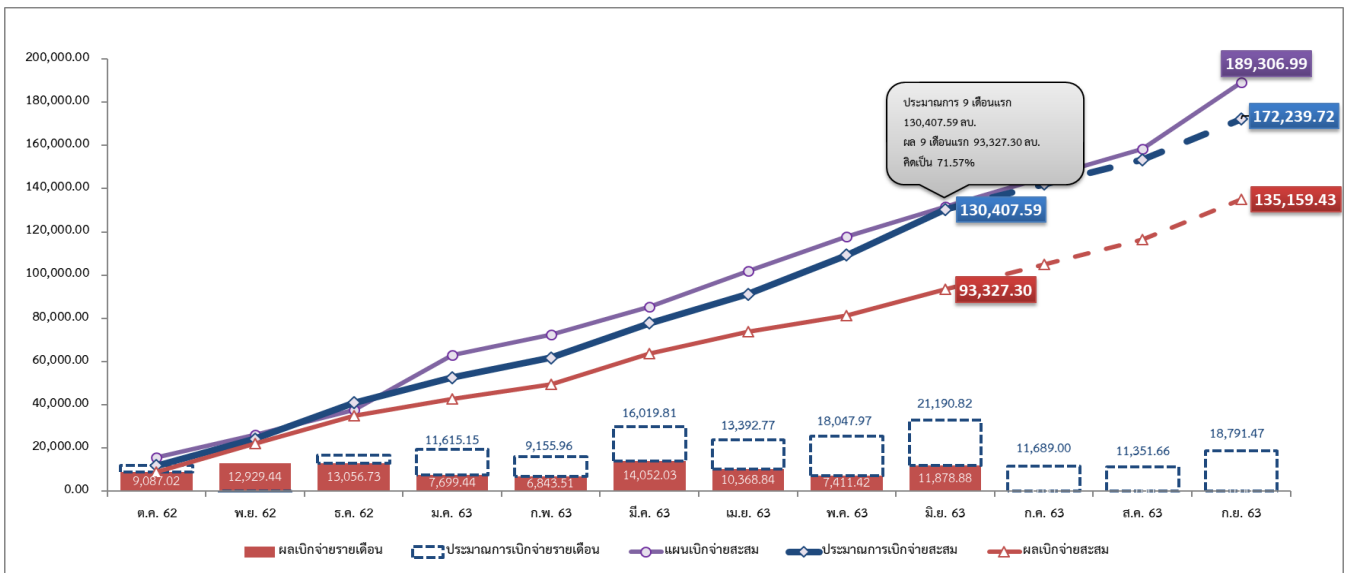

แผนภาพที่ 4: ประมาณการเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกรายเดือน

เมื่อแบ่งผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนตามแผนภาพที่ 4 จะเห็นว่ามี การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 62) จำนวน 35,073.19 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. – มี.ค. 63) จำนวน 28,594.97 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. – มิ.ย. 63) จำนวน 29,659.14 ล้านบาท และในช่วง 3 เดือนที่เหลือ (เดือน ก.ค. – ก.ย. 63) หากหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน คาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 จะมีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนทั้งสิ้น 135,159.43 ล้านบาท


ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม จำนวน 93,327.30 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ (ในประเทศและต่างประเทศ) สะสม จำนวน 59,389.34 ล้านบาท (ร้อยละ 64) การเบิกจ่ายเงินรายได้สะสม จำนวน 32,392.47 ล้านบาท (ร้อยละ 34) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 1,545.49 ล้านบาท (ร้อยละ 2) ตามแผนภาพที่ 5

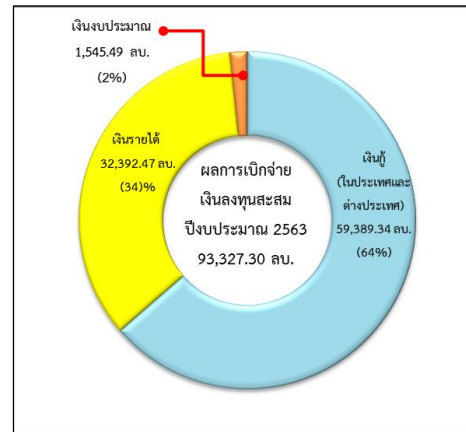

แผนภาพที่ 5: ผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ปี 63 แยกตามแหล่งเงิน

เปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563

การเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 รายหน่วยงาน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ตามแผนภาพที่ 6

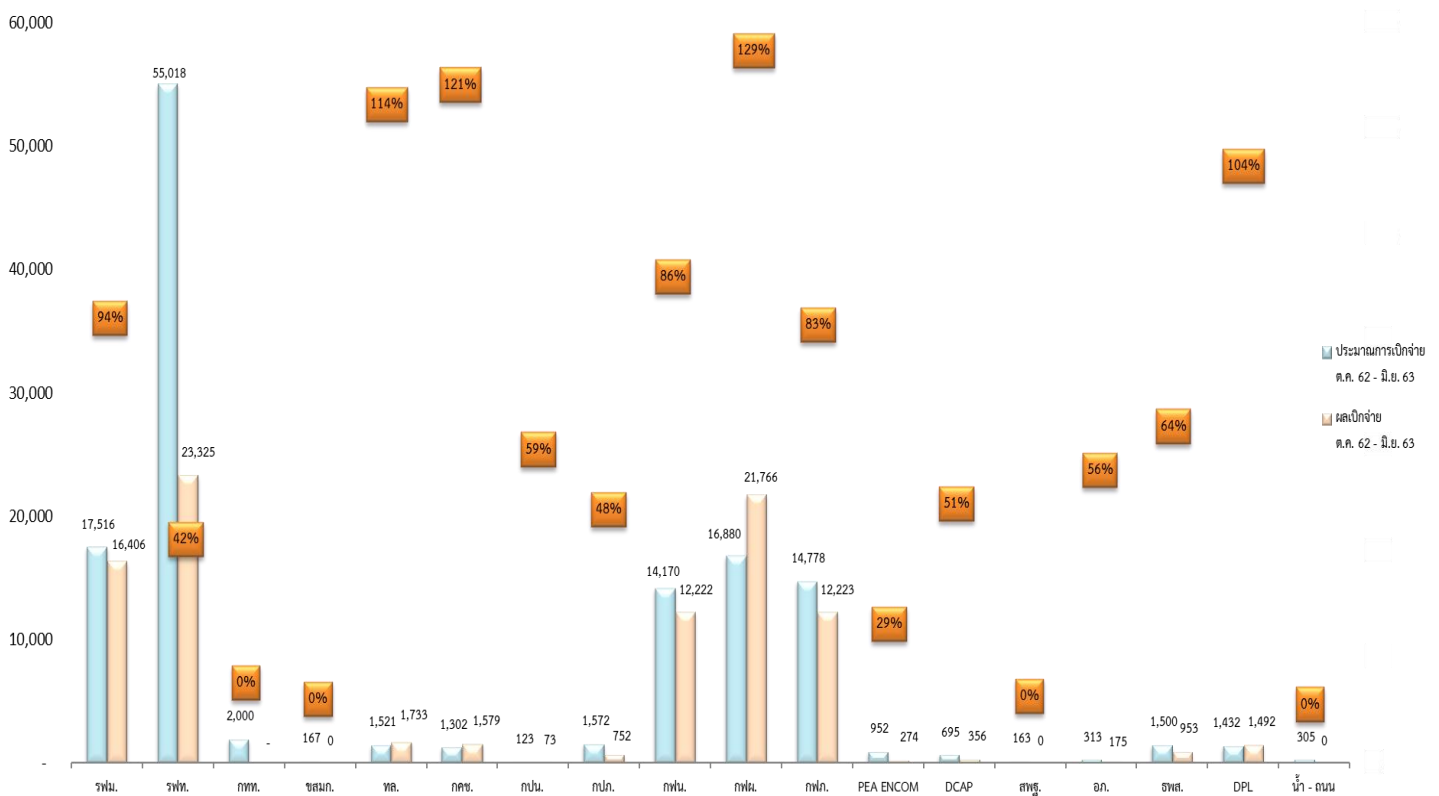

แผนภาพที่ 6: ประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนในปีงบประมาณ 2563 แยกตามหน่วยงาน

เมื่อเปรียบเทียบประมาณการเบิกจ่ายและผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐสะสม ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2563 สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานได้ ดังนี้ 1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน 2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนต่ำกว่าประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุน และ 3) หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม**สูงกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม ประกอบด้วย (1) **การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 129 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากคู่สัญญาเร่งรัดการดำเนินงานปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เชื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 มีผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผน ร้อยละ 3.00 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตก-ภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มีผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผนร้อยละ 3.62 และโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร มีผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผน ร้อยละ 2.06 เป็นต้น (2) **การเคหะแห่งชาติ (กคช.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 121 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม แม้ว่า กคช. จะมีผลเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสม แต่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานได้เร็วกว่าแผนจริงเพราะเป็นผลมาจากที่ผ่านมา กคช. มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการต่างๆ ล่าช้าสะสมมาโดยตลอด โดยมีการเร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ ทำให้มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าประมาณการเบิกจ่ายสะสม (3) **กรมทางหลวง (ทล.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 114 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจากสามารถก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร ได้เร็วกว่าแผนการก่อสร้าง โดย ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 63 มีผลการดำเนินการก่อสร้างร้อยละ 79.98 จากแผนการก่อสร้างร้อยละ 62.68

2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสม**ต่ำกว่า**ประมาณการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมประกอบด้วย (1) **รฟท.** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 42 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจาก โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน งานก่อสร้างสัญญางานโยธาช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 มีความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง และสัญญางานโยธาช่วงที่ 3 และ 4 จำนวน 12 สัญญา อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน รวมทั้ง โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช และโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มัถกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง (Missing Link) เนื่องจากทั้ง 4 โครงการ รฟท. อยู่ระหว่างศึกษาการดำเนินโครงการในรูปแบบ PPP เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐ โดย รฟท. ได้ขออนุมัติแผนการกู้เงินของทั้ง 4 โครงการดังกล่าวออกจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 แล้ว (2) **การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 48 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสมเนื่องจากโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. เช่น สาขาชลบุรี สาขาปทุมธานี และสาขาฉะเชิงเทรา เป็นต้น เกิดความล่าช้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของไวรัส Covid - 19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง และในช่วงที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลาดังกล่าวได้ทำให้เกิดความล่าช้าสะสม รวมทั้งโครงการบางส่วนยังอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างแก้ไขสัญญา แก้ไขแบบและจัดซื้อที่ดิน ออกแบบสำรวจและขออนุญาตใช้ที่ดิน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน (3) **องค์การเภสัชกรรม (อภ.)** มีผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนสะสมร้อยละ 56 ของประมาณการเบิกจ่ายสะสม เนื่องจาก โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานของผู้รับเหมาและไม่สามารถขนย้ายแรงงานจำนวนมากได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 บริษัทผู้รับเหมาจึงได้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปริมาณแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคณะกรรมการตรวจรับงานได้เห็นชอบการปรับแผนแล้วเมื่อเดือน เม.ย. 63

3) หน่วยงานที่**ไม่มีผลการเบิกจ่าย**เงินลงทุน ประกอบด้วย (1) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 งานถมทะเลอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติผู้รับจ้างต่อคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือน ส.ค. 63 สำหรับงานก่อสร้างทางบก อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง โดยเปิดขายเอกสารการประกวดราคาแล้วระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 14 ส.ค. 63 (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเนื่องจากโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ต้องเลื่อนการส่งนักเรียนรุ่นที่ 1 ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นจากเดือน เม.ย. 63 เป็น เดือน ต.ค. 63 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 และการก่อสร้างสถาบันไทย - Kosen ทั้ง 2 แห่ง ยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง
